

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครั้งที่ 2 เดือน มกราคม 2567

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.



สำนักงานงบประมาณและการเงิน

31 มกราคม 2567

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เดือน มกราคม 2567
วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล Conference)
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ข้อตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชี (กช.)
- 2.2 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMS
ณ วันที่ 24 ม.ค.67 (กช.)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูล ณ วันที่
24 ม.ค.67 (กง.)
- 3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค.67
(งป.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- 4.1 การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สงป.)
- 4.2 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ ตร. (สงป.)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ข้อตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชี (กข.)



ข้อควรพิจารณาที่สำคัญจากภาวะ การขอจบการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี





ข้อควรพบที่สำคัญจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี

บัญชีหักภาษีพย

กรณีได้มาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อตรวจสอบงานจะเกิด บัญชีหักภาษีพย ในระบบ New GFMS Thai และเมื่อเบิกเงินเดือนเพื่อชำระค่าสิทธิพยแล้ว ให้ล้างบัญชีหักสิทธิพยเป็นสิทธิพยรายตัว หรือ ค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕ วันทำการ

(หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/4876 ลง 20 ธ.ค.66 แนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสิทธิพยในระบบ New GFMS Thai)

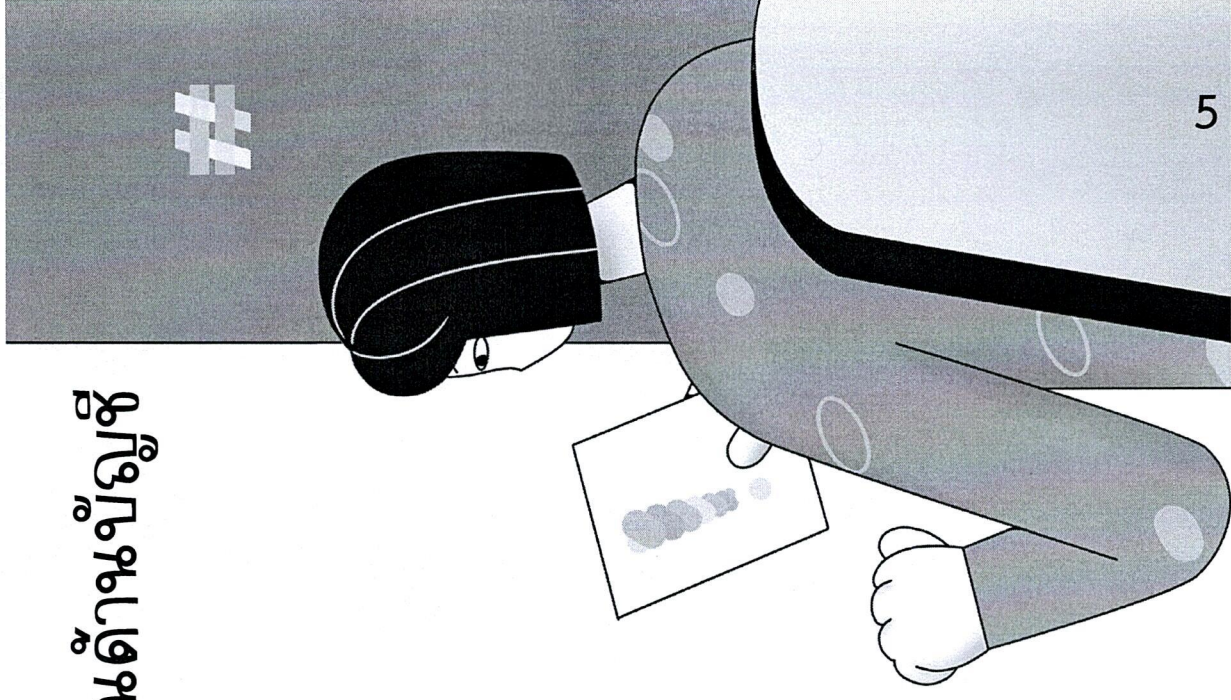




รายงานข้อเสนอแนะจากภาคีการตรวจสุขภาพทาง การเงิน ของ ทร. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. สืบหาแพคเกจระบบ GFMIS แต่ไม่มีในรายงานรายละเอียด
หาแพคเกจให้ตรวจสอบ
2. สืบหาแพคเกจอยู่ในครอบครอง แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS
3. มีคุณลักษณะที่อยู่นอกกรอบของ แต่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS
4. การบันทึกลักษณะระบบ GFMIS รวมถึงทั้งจำนวน โดยไม่ได้แยก
ลักษณะเป็นแพคเกจที่ต่อออกนี้จึง
5. รายงานเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย ไม่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบ
ได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิพักอาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์
6. เงินประกันสัญญา ไม่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของ
คู่สัญญารายใด

กองบัญชี สำนักงานปราบปรามและภาษีอากร
<https://www.accountancy-police.go.th>

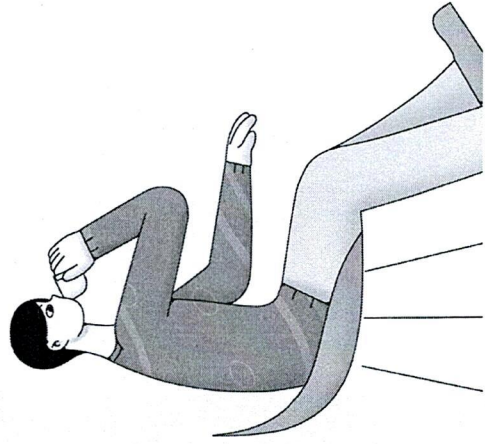

2.2 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMS
ณ วันที่ 24 ม.ค.67 (กข.)



รหัสผู้ใช้: H25007000100101
 วันที่เรียกดูรายงาน: 24/01/2024
 ชื่อชุด ณ วันที่: งบกลางปี 2567
 LOGOUT



ปีงบประมาณ: 2567 | เดือน: - | กรม: กรมสรรพากร | จังหวัด: กรุงเทพมหานคร | หน้า: 1 / 3

เลือกทั้งหมด | เลือกทั้งหมด | เลือกทั้งหมด | เลือกทั้งหมด

▼ กดเพื่อดูค่าตัวเลือก

D01: รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ
(ภาพรวม ประจำปี ลงทุน)

ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2567

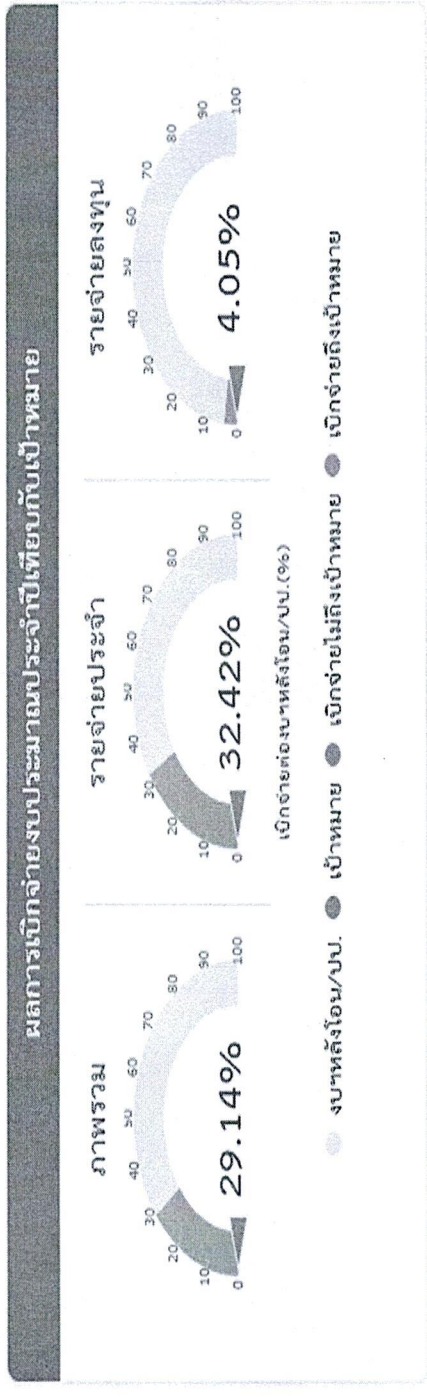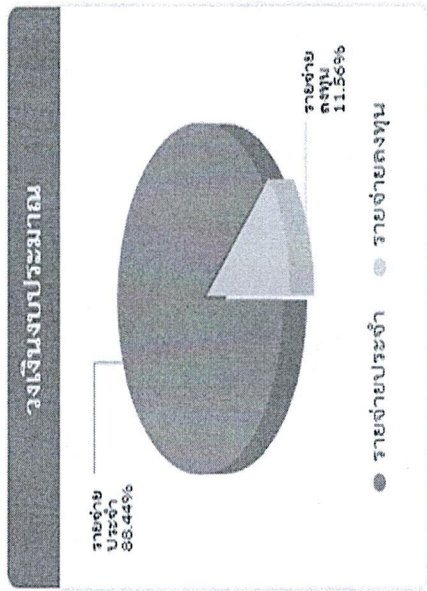

ลักษณะเศรษฐกิจ	หน่วยเงิน บาท		
	งบกลางปี/งบ.เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายต่อบาทลงทุน/เปลี่ยนแปลง(%)
รวม	115,081,404,100.00	33,530,695,851.51	29.14
รายจ่ายประจำ	101,776,895,900.00	32,991,203,012.69	32.42
รายจ่ายลงทุน	13,304,508,200.00	539,492,838.82	4.05
		เป้าหมาย(%)	ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย(%)
		37.27	-8.13
		40.27	-7.85
		24.27	-20.22

ที่มาของเป้าหมาย : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนที่ชุด ที่ นร 0505/ว 427 ตว.28 ก.ย.2565





รหัสผู้ใช้: M25007000100101
วันที่เรียกรายงาน: 24/01/2024
ข้อมูล ณ วันที่: 23 มกราคม 2567

ชื่องบประมาณ: 2567 | เลือกทั้งหมด | กรม: เลือกทั้งหมด | จังหวัด: กรุงเทพมหานคร | ทั้งหมด/ส่วนราชการ: 1 / 3 | เปิดจ่าย/ใช้จ่าย: ใช้จ่าย

D01: รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ภาพรวม ประจำปี ลงทุน)

ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2567

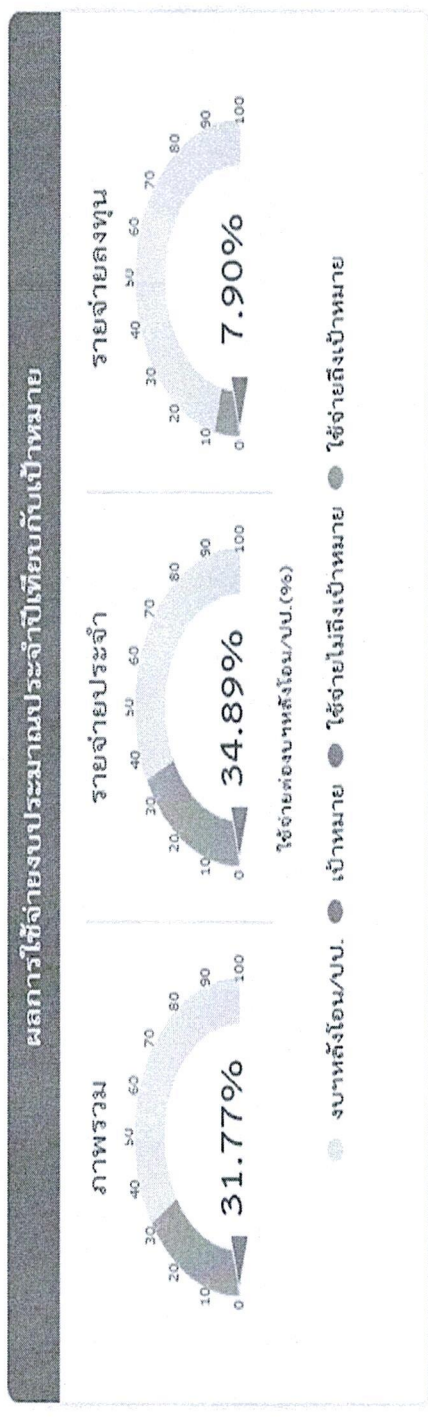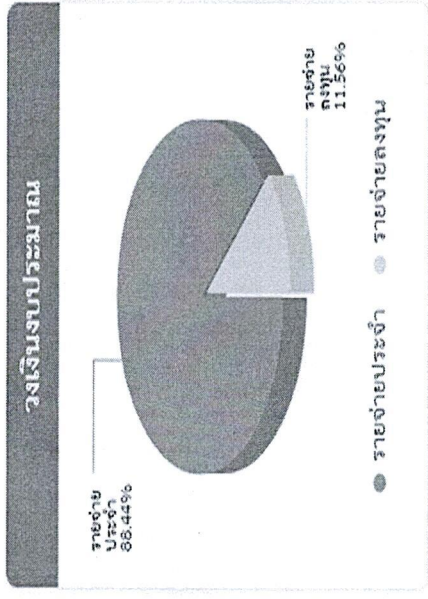

ลักษณะเศรษฐกิจ	งบบาทตั้งโอน/เปลี่ยนแปลง		ผลการใช้จ่าย		ผลการใช้จ่ายต่องบบาทตั้งโอน/เปลี่ยนแปลง(%)		เป้าหมาย(%)		สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย(%)	
	รวม	งบบาทตั้งโอน/เปลี่ยนแปลง	รวม	งบบาทตั้งโอน/เปลี่ยนแปลง	รวม	งบบาทตั้งโอน/เปลี่ยนแปลง	รวม	งบบาทตั้งโอน/เปลี่ยนแปลง	รวม	งบบาทตั้งโอน/เปลี่ยนแปลง
รวม	115,081,404,100.00	36,559,803,928.56	31.77	39.92	40.72	-8.15	39.92	40.72	-5.83	-8.15
รายจ่ายประจำ	101,776,895,900.00	35,508,392,828.56	34.89	36.66	36.66	-8.16	36.66	36.66	-8.16	-8.16
รายจ่ายลงทุน	13,304,508,200.00	1,051,411,100.00	7.90	7.90	7.90	0.00	7.90	7.90	0.00	-28.76

ที่มาของเป้าหมาย : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนที่ชุดที่ นร 0505/ร 427 ตว.28 ก.ย.2565

รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 24 ม.ค. 2567

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 66 กลางก่อน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	การใช้จ่ายสะสม	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10) = (2) - (8)	(11)
งบบุคลากร	82,068,692,500.00	54,165,337,000.00	-	-	28,824,436,251.34	35.12	28,824,436,251.34	35.12	53,244,256,248.66	64.88
งบดำเนินงาน	17,378,915,900.00	13,509,302,900.00	2,504,505,937.15	14.41	3,682,194,327.24	21.19	6,186,700,264.39	35.60	11,192,215,635.61	64.40
งบลงทุน	13,304,508,200.00	2,754,759,900.00	511,918,261.18	3.85	539,492,838.82	4.05	1,051,411,100.00	7.90	12,253,097,100.00	92.10
งบอุดหนุน	323,596,800.00	227,372,500.00	3,375,110.00	1.04	47,779,088.41	14.77	51,154,198.41	15.81	272,442,601.59	84.19
งบรายจ่ายอื่น	2,005,690,700.00	1,198,086,300.00	9,231,182.22	0.46	438,950,109.70	21.89	448,181,291.92	22.35	1,557,509,408.08	77.65
รวมทั้งสิ้น	115,081,404,100.00	71,854,858,600.00	3,029,030,490.55	2.63	33,532,852,615.51	29.14	36,561,883,106.06	31.77	78,519,520,993.94	68.23

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 24 ม.ค.67

ไตรมาสที่ 2 (24 ม.ค.67)

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 37.27 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.13 / เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 39.92 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.15

2.งบประมาณรายจ่ายประจำ

เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.27 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.85 / เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 40.72 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.83

3.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 24.27 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 20.22 / เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 36.66 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 28.76

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บช. และ บก. ในสังกัด สจ.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 24 ม.ค. 2567

(เรียงลำดับตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	สปร.	5,881,800.00	-	-	5,502,500.00	93.55	5,502,500.00	93.55	379,300.00	6.45
2	สพส.	458,399,284.00	376,057,580.48	82.04	11,963,131.52	2.61	388,020,712.00	84.65	70,378,572.00	15.35
3	สขป.	193,720,827.00	1,584,762.26	0.82	161,766,866.72	83.51	163,351,628.98	84.32	30,369,198.02	15.68
4	สกบ.	4,441,253,379.14	2,169,925,916.71	48.86	1,435,151,445.23	32.31	3,605,077,361.94	81.17	836,176,017.20	18.83
5	บช.สอท.	119,681,634.18	80,679,784.56	67.41	12,270,941.99	10.25	92,950,726.55	77.66	26,730,907.63	22.34
6	สคตม.	73,707,494.00	7,095,463.22	9.63	37,722,243.90	51.18	44,817,707.12	60.80	28,889,786.88	39.20
7	บช.ปส.	455,438,840.00	105,876,489.88	23.25	137,468,852.93	30.18	243,345,342.81	53.43	212,093,497.19	46.57
8	บช.ทพ.	8,702,700.00	-	-	4,413,945.52	50.72	4,413,945.52	50.72	4,288,754.48	49.28
9	ภ.5	447,287,707.00	44,590,737.00	9.97	177,824,813.00	39.76	222,415,550.00	49.73	224,872,157.00	50.27
10	บช.น.	736,919,403.06	63,622,769.08	8.63	302,723,524.09	41.08	366,346,293.17	49.71	370,573,109.89	50.29
11	บช.ส.	127,737,463.30	13,084,364.10	10.24	47,631,829.50	37.29	60,716,193.60	47.53	67,021,269.70	52.47
12	บช.ตชต.	1,155,200,464.00	22,603,681.88	1.96	500,904,406.73	43.36	523,508,088.61	45.32	631,692,375.39	54.68
13	ตพ.	24,482,049.00	1,219,356.70	4.98	9,778,356.81	39.94	10,997,713.51	44.92	13,484,335.49	55.08
14	วณ.	3,783,252.00	207,597.40	5.49	1,461,740.55	38.64	1,669,337.95	44.12	2,113,914.05	55.88
15	สคตส.	12,655,400.00	537,224.20	4.25	4,946,393.23	39.09	5,483,617.43	43.33	7,171,782.57	56.67
16	บช.ภ.	480,737,112.63	64,966,381.35	13.51	135,587,434.04	28.20	200,553,815.39	41.72	280,183,297.24	58.28
17	สกพ.	35,240,157.00	2,616,014.33	7.42	11,856,816.39	33.65	14,472,830.72	41.07	20,767,326.28	58.93
18	ภ.3	512,171,530.00	8,558,347.60	1.67	201,709,030.12	39.38	210,267,377.72	41.05	301,904,152.28	58.95
19	ภ.9	1,097,170,612.00	13,425,020.00	1.22	430,924,276.91	39.28	444,349,296.91	40.50	652,821,315.09	59.50

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 24 ม.ค. 2567

(เรียงลำดับตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
20	ภ.1	414,122,222.50	1,467,876.14	0.35	163,227,524.80	39.42	164,695,400.94	39.77	249,426,821.56	60.23
21	ภ.4	527,178,717.50	1,966,722.77	0.37	204,360,246.24	38.76	206,326,969.01	39.14	320,851,748.49	60.86
22	ภ.7	326,116,836.00	5,232,377.19	1.60	122,263,971.85	37.49	127,496,349.04	39.10	198,620,486.96	60.90
23	สง.ภ.ตร.	11,661,500.00	244,347.26	2.10	4,313,354.28	36.99	4,557,701.54	39.08	7,103,798.46	60.92
24	ภ.8	314,888,085.00	5,684,621.63	1.81	117,157,030.87	37.21	122,841,652.50	39.01	192,046,432.50	60.99
25	สพ.	9,332,116.00	1,382,009.84	14.81	2,216,838.32	23.75	3,598,848.16	38.56	5,733,267.84	61.44
26	ภ.6	390,649,417.00	1,881,937.40	0.48	147,334,845.37	37.72	149,216,782.77	38.20	241,432,634.23	61.80
27	ภ.2	328,773,530.00	1,914,197.19	0.58	122,460,536.43	37.25	124,374,733.62	37.83	204,398,796.38	62.17
28	สง.ภ.ต.ช.	1,874,000.00	-	-	683,467.87	36.47	683,467.87	36.47	1,190,532.13	63.53
29	รพ.ตร.	114,076,729.00	2,916,082.51	2.56	37,315,832.76	32.71	40,231,915.27	35.27	73,844,813.73	64.73
30	ร.ร.นรต.	100,979,188.00	1,784,110.94	1.77	33,377,647.61	33.05	35,161,758.55	34.82	65,817,429.45	65.18
31	สภ.ภ.ตร.	11,159,608.00	1,544,718.25	13.84	2,277,158.01	20.41	3,821,876.26	34.25	7,337,731.74	65.75
32	บช.ศ.	117,808,237.00	9,699,142.70	8.23	20,403,967.36	17.32	30,103,110.06	25.55	87,705,126.94	74.45
33	สย.ศ.ตร.	81,679,332.00	4,643,547.79	5.69	14,876,858.71	18.21	19,520,406.50	23.90	62,158,925.50	76.10
34	สพฐ.ตร.	185,265,830.00	8,664,958.33	4.68	35,302,723.42	19.06	43,967,681.75	23.73	141,298,148.25	76.27
35	จต.	25,059,160.00	1,508,198.71	6.02	4,185,539.83	16.70	5,693,738.54	22.72	19,365,421.46	77.28
36	กม.ค.	23,357,090.00	702,198.15	3.01	4,560,539.70	19.53	5,262,737.85	22.53	18,094,352.15	77.47
37	บ.ตร.	1,021,823,169.00	942,078.00	0.09	14,164,932.98	1.39	15,107,010.98	1.48	1,006,716,158.02	98.52

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค.67 (กง.)

รายการขอคืนเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี รอบ กันยายน 2566
กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน
ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67

รายการ	กระทรวงการคลังอนุมัติ		หน่วยสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)			เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		หมายเหตุ
	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เงินเหลือจากการสร้าง PO	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน		
เอกสารสำรองเงินประเภท CX	126	-	-	-	-	-	32	**786,749,905.00	ยังไม่สร้าง PO	
		-	-	-	-	-	1	*79,460,592.00	ผู้ขายต่างประเทศ	
		54	578,498,473.38		164,144,245.72	-	54	*578,498,473.38	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
		5	754,420,000.00		2,224,000.00		5	384,466,675.79	เบิกแล้วบางส่วน	
		34	83,105,621.98		7,515,341.02	34	-	-	เบิกจ่ายหมดแล้ว	
	93	1,416,024,095.36		173,883,586.74	34	453,058,946.19	92	1,829,175,646.17		

*เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 29 มี.ค.67 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.67)

**เร่งรัดจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ภายใน 25 มี.ค.67 เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.67)

เปรียบเทียบ

รายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566

ที่ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO + จัดหาจากต่างประเทศ

ลำดับ	หน่วย	ประชุมเดือน พ.ย.66		ประชุมเดือน ม.ค.67		ลดลง	
		รก.	เงิน	รก.	เงิน	รก.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		95	2,328,325,141.10	33	866,210,497.00	-62	- 1,462,114,644.10
1	สยศ.ตร.	1	375,000,000.00	1	375,000,000.00	0	0.00
2	สกพ.	1	4,426,700.00	0	0.00	-1	- 4,426,700.00
3	บช.น.	1	27,920,000.00	0	0.00	-1	- 27,920,000.00
4	ภ.1	10	5,512,800.00	3	505,400.00	-7	- 5,007,400.00
5	ภ.3	1	12,821,800.00	0	0.00	-1	- 12,821,800.00
6	ภ.4	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ภ.5	13	15,271,400.00	0	0.00	-13	- 15,271,400.00
8	ภ.6	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	ภ.8	3	24,841,000.00	0	0.00	-3	- 24,841,000.00
10	ภ.9	2	8,950,000.00	2	8,950,000.00	0	0.00
11	บช.ทท.	3	44,653,400.00	0	0.00	-3	- 44,653,400.00
12	บช.ตชด.	8	36,662,211.00	2	18,804,271.00	-6	- 17,857,940.00
13	สพฐ.ตร.	2	2,364,700.00	0	0.00	-2	- 2,364,700.00
14	สทส.	4	1,935,480.00	0	0.00	-4	- 1,935,480.00
15	บช.ศ.	2	6,042,000.00	0	0.00	-2	- 6,042,000.00
16	รร.นรด.	4	21,509,995.25	2	13,558,000.00	-2	- 7,951,995.25
17	รพ.ตร.	1	6,000,000.00	0	0.00	-1	- 6,000,000.00
18	สกบ.	39	1,734,413,654.85	23	449,392,826.00	-16	- 1,285,020,828.85
	พร	8	1,218,587,390.00	1	91,341,000.00	-7	- 1,127,246,390.00
	ยธ	23	389,294,300.00	17	247,542,514.00	-6	- 141,751,786.00
	สพ.	8	126,531,964.85	5	110,509,312.00	-3	- 16,022,652.85

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai

หมายเหตุ : สกบ.(สพ.) เป็นวงเงินที่รวมรายการจัดหาจาก ตปท. แล้ว จำนวน 1 รายการ (ไม่ต้องสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO))

รายการ รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 10 คัน จำนวนเงิน 79,460,592 บาท

ลำดับ	หน่วย	จำนวนทั้งสิ้น		สร้างไปตั้งซื้อจ้าง (PO)		เบิกจ่ายสะสม		เบิกจ่ายต่อ		เหลือจ่าย		ยังไม่สร้างไปตั้งซื้อจ้าง (PO)+จัดทาจจาก ตปท. (6)=(1)-(2)-(5)		คงเหลือทั้งสิ้น	
		รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		126	2,456,118,179.10	93	1,416,024,095.36	34	453,058,946.19	59	962,965,149.17	173,883,586.74	33	866,210,497.00	92	1,829,175,646.17	
1	สยศ.ตร.	1	375,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	375,000,000.00	1	375,000,000.00	
2	สทพ.	8	21,508,700.00	8	16,802,000.00	0	0.00	8	16,802,000.00	4,706,700.00	0	0.00	8	16,802,000.00	
3	บชน.	3	43,546,000.00	3	41,751,141.00	0	0.00	3	41,751,141.00	1,794,859.00	0	0.00	3	41,751,141.00	
4	ภ.1	10	5,512,800.00	7	4,276,846.98	7	4,276,846.98	0	0.00	730,553.02	3	505,400.00	3	505,400.00	
5	ภ.3	7	16,464,800.00	7	14,531,440.00	6	1,709,640.00	1	12,821,800.00	1,933,360.00	0	0.00	1	12,821,800.00	
6	ภ.4	4	1,096,400.00	4	1,096,400.00	4	1,096,400.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	-	
7	ภ.5	14	16,111,400.00	14	14,110,800.00	5	2,456,900.00	9	11,653,900.00	2,000,600.00	0	0.00	9	11,653,900.00	
8	ภ.6	1	9,990,000.00	1	8,780,000.00	0	1,317,000.00	1	7,463,000.00	1,210,000.00	0	0.00	1	7,463,000.00	
9	ภ.8	10	27,450,363.00	10	26,251,900.00	8	6,106,900.00	2	20,145,000.00	1,198,463.00	0	0.00	2	20,145,000.00	
10	ภ.9	2	8,950,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2	8,950,000.00	2	8,950,000.00	
11	บช.พท.	3	44,653,400.00	3	44,352,900.00	1	999,500.00	2	43,353,400.00	300,500.00	0	0.00	2	43,353,400.00	
12	บช.ตชต.	9	61,872,361.00	7	41,681,555.00	1	24,934,745.00	6	16,746,810.00	1,386,535.00	2	18,804,271.00	8	35,551,081.00	
13	สพฐ.ตร.	2	2,364,700.00	2	2,364,700.00	1	1,196,200.00	1	1,168,500.00	0.00	0	0.00	1	1,168,500.00	
14	สพส.	4	1,935,480.00	4	1,933,875.00	0	0.00	4	1,933,875.00	1,605.00	0	0.00	4	1,933,875.00	
15	บช.ศ.	2	6,042,000.00	2	4,645,500.00	0	0.00	2	4,645,500.00	1,396,500.00	0	0.00	2	4,645,500.00	
16	รร.นรต.	5	23,208,995.25	3	9,157,880.00	0	0.00	3	9,157,880.00	493,115.25	2	13,558,000.00	5	22,715,880.00	
17	รพ.ตร.	1	6,000,000.00	1	4,691,218.00	0	0.00	1	4,691,218.00	1,308,782.00	0	0.00	1	4,691,218.00	
18	สทบ.	40	1,784,410,779.85	17	1,179,595,939.38	1	408,964,814.21	16	770,631,125.17	155,422,014.47	23	449,392,826.00	39	1,220,023,951.17	
	พธ	8	1,218,587,390.00	7	973,765,290.00	1	397,715,334.21	6	576,049,955.79	153,481,100.00	1	91,341,000.00	7	667,390,955.79	
	ยธ	23	389,294,300.00	6	139,816,900.00	0	11,249,480.00	6	128,567,420.00	1,934,886.00	17	247,542,514.00	23	376,109,934.00	
	สท.	9	176,529,089.85	4	66,013,749.38	0	0.00	4	66,013,749.38	6,028.47	5	110,509,312.00	9	176,523,061.38	

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai

หมายเหตุ : สบ.(สพ.) เป็นวงเงินที่รวมรายการจัดทาจจาก ตปท. แล้ว จำนวน 1 รายการ (ไม่ต้องสร้างไปตั้งซื้อจ้าง (PO))รายการ รถยนต์คุ้มครองกันกระสุน จำนวน 10 คัน จำนวนเงิน 79,460,592 บาท

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเพิ่มเติมปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบกระทรวงการคลังอนุมัติ	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 ธ.ค.66	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มคืนและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนวงลงนามทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงวงลงนามที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 31 ธ.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	CX	CX00000375	ทบ.	โครงการสมาร์ต เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0)	6611310	375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00			อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3	อยู่ระหว่างปรับปรุงวงจรกิจกรรมครั้งที่ 2 โดยโครงการนี้ให้รับงบประมาณเมื่อเดือน ต.ค. 65 มีการประกาศใช้วงจรกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.66 - 3 ก.ค.66 และมีผู้ใช้งาน 2 บริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุง และประกาศใช้วงจรกิจกรรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 - 27 ก.ค.66 มีผู้ใช้งาน 4 บริษัท คณะกรรมการชุดเดิมได้มีการทำเอกสารตอบรับจรรยาบรรณเรียบร้อยแล้ว แต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและสมช.ลุ่มคห. ได้มีการขอเพิ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก สม.ลุ่มคห. เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ต้องปรับปรุงในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาฐานแม่ข่ายและเอชไอที อาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้วิธีการแบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎกระทรวง ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและบรรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรขอความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้าน Cyber Security and CCTV เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ สมาร์ต เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0)
				รวม สมช.ศร. จำนวน 1 รายการ		375,000,000.00	375,000,000.00	375,000,000.00				

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่รวมบัญชีกลางอนุมัติให้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปเบิกเพื่อมี ครอบ กัษยาน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 ค.ศ.66	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มนับและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวน 1 งวดงาน/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 31 ค.ศ.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	CX	CX00000339	ภ.จว.สระบุรี (ภ.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 17 ชุด	6611310	380,000.00	380,000.00	380,000.00	จำนวน 1 งวดงาน/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย สามารถลงนามได้วันที่ 3 พ.ย.2566 / ส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 8 พ.ย.2566	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย สามารถลงนามได้วันที่ 31 ค.ศ.66	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	
2	CX	CX00000340	ภ.จว.สระบุรี (ภ.1)	เครื่องพิมพ์แบบสีพิมพ์ จำนวน 17 ชุด	6611310	77,900.00	77,900.00	77,900.00	จำนวน 1 งวดงาน/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย สามารถลงนามได้วันที่ 3 พ.ย.2566 / ส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 8 พ.ย.2566	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย สามารถลงนามได้วันที่ 31 ค.ศ.66	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	
3	CX	CX00000341	ภ.จว.สระบุรี (ภ.1)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 17 ชุด	6611310	47,500.00	47,500.00	47,500.00	จำนวน 1 งวดงาน/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย สามารถลงนามได้วันที่ 3 พ.ย.2566 / ส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 8 พ.ย.2566	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาซื้อขาย สามารถลงนามได้วันที่ 31 ค.ศ.66	ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	
				รวม ภ.1 จำนวน 3 รายการ		505,400.00	505,400.00	505,400.00					

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใช้เป็นเดือนปี รอบ กันยายน 2566												
ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค.66	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มสิ้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเป็นถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า/ ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า/ ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	CX	CX00000335	ภ.จว.สงขลา (ภ.9)	โครงการปรับปรุงห้องประชุมตำราจตุรจักรจังหวัดสงขลา (ชั้น 2 ห้องประชุมสนิมหาล)	6611320	4,480,000.00	4,480,000.00	4,480,000.00	จำนวน 4 งวด 150 วัน	อนุมัติสั่งจ้าง กับ ทั้งสิ้นส่วน จำกัด อนุภร ชัพพลาย เซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 3,845,000.00 บาท แต่เนื่องจาก ทั้งสิ้นส่วน จำกัด อนุภร ชัพพลาย เซอร์วิส โดยขอ อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จึงได้ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา อนุมัติสั่งจ้าง กับ ทั้งสิ้นส่วน จำกัด อนุภร ชัพพลาย เซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 4,038,000.00 บาท แต่เนื่องจาก ทั้งสิ้นส่วน จำกัด อนุภร ชัพพลาย เซอร์วิส โดยขอ อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จึงได้ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติ	ระหว่างพิจารณาอนุมัติ จากกรมบัญชีกลาง	
2	CX	CX00000336	ภ.จว.สงขลา (ภ.9)	โครงการปรับปรุงห้องประชุมตำราจตุรจักรจังหวัดสงขลา (ชั้น 1 ห้องประชุมขลาคัทนี)	6611320	4,470,000.00	4,470,000.00	4,470,000.00	จำนวน 4 งวด 150 วัน	อนุมัติสั่งจ้าง กับ ทั้งสิ้นส่วน จำกัด อนุภร ชัพพลาย เซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 4,038,000.00 บาท แต่เนื่องจาก ทั้งสิ้นส่วน จำกัด อนุภร ชัพพลาย เซอร์วิส โดยขอ อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จึงได้ส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติ	ระหว่างพิจารณาอนุมัติ จากกรมบัญชีกลาง	
				รวม ภ.9 จำนวน 2 รายการ		8,950,000.00	8,950,000.00	8,950,000.00				

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค.66	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	CX	CX00000277	บข.คชด.	ชื่อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รองเท้า,ถุงเท้า,เข็มขัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการ	6611410	9,549,971.00	9,549,971.00	9,549,971.00			อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ	อยู่ระหว่างกรมเอกสารอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
2	CX	CX00000348	บข.คชด.	ชื่อสิ่งส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ประจำโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 86 รายการ (ครั้งที่ 2)	6611500	9,254,300.00	9,254,300.00	9,254,300.00			ขอปฏิบัติประกาศร่าง TOR หลังมีวิจารณ์	ยกเลิกจัดหาครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 3 เสนอราคาวันที่ 23 ม.ค.67
				รวม บข.คชด. จำนวน 2 รายการ		18,804,271.00	18,804,271.00	18,804,271.00				

รายงานรายการเอกสารการชำระเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติโอนเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปเบิกหลอมมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค.66	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนวงจงบังคับ/ปัจจุบันเป็นถึงวงจบบังคับ (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	CX	CX00000330	ร.ร.มธ.	งานปรับปรุงระบบห้องส่งน้ำ โรงเรียนนานาชาติรรจ	6611320	9,134,000.00	9,134,000.00	9,134,000.00	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนวงจบบังคับ/ปัจจุบันเป็นถึงวงจบบังคับ (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
											อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (27 ต.ค. - 13 พ.ย.66)	หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/2752 ลง 23 ม.ค.67 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ตามที่ ดร. โดย วัตถุประสงค์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. งานติดตั้งระบบท่อส่งน้ำบาดาล ระยะที่ 2 รร.มธ. 1,121,500 บาท 2. คอมพิวเตอร์เริ่มฝึกพร้อมสถานออก รอยต่อบริเวณอาคารสวนพราณิกรมย์ จำนวน 7,258,800 บาท 3. ปรับปรุงหลังคาโรงครัวหาวน รร.มธ. จำนวน 417,000 บาท 4. งานปรับปรุงอะไหล่ในพื้นที่ 300 ไร่ รร.มธ. จำนวน 316,400 บาท
2	CX	CX00000331	ร.ร.มธ.	งานปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก รร.มธ.	6611320	4,424,000.00	4,424,000.00	4,424,000.00			รอรายงานผลการสุพรรณิจากกรมบัญชีกลาง	-อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR และประกาศประกวดราคา คาดว่าจะประกวดประกาศประกวดระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค.67 และขึ้นข้อเสนอเข้าเสนอราคาในระบบฯ วันที่ 31 ม.ค.67
				รวม รร.มธ. จำนวน 2 รายการ		13,558,000.00	13,558,000.00	13,558,000.00				

รายงานรายการเอกสารสำราจเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กึ่งเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เป็นเหมือนปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค.66	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	CX	CX00000403	พธ.	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและเสียงชนิดติดตัว จำนวน 10,149 ชุด	6610310	91,341,000.00	91,341,000.00	91,341,000.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ	
2	CX	CX00000376	ยธ.	รวม พธ. จำนวน 1 รายการ	6611320	91,341,000.00	91,341,000.00	91,341,000.00	ทั้งหมด 98 งวด ยังไม่เบิกจ่าย		อยู่ระหว่างพิจารณา	
3	CX	CX00000377	ยธ.	อาคารที่ทำการหรืออาคารที่จอดรถยนต์ จำนวนบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 อาคาร	6611320	181,600,000.00	181,600,000.00	181,600,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา		อยู่ระหว่างพิจารณาและราคา	
4	CX	CX00000378	ยธ.	อาคารที่ทำการ สม.ของพ่อ พร้อมที่กัก แรวงของเงินเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	6611320	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
5	CX	CX00000379	ยธ.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสุขียุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	6611320	11,503,800.00	11,503,800.00	11,503,800.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา		อยู่ระหว่างพิจารณา	
6	CX	CX00000380	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สท.	6611310	94,000.00	94,000.00	94,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
7	CX	CX00000381	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สท.	6611310	54,400.00	54,400.00	54,400.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
8	CX	CX00000382	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สท.	6611310	195,000.00	195,000.00	195,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	
9	CX	CX00000383	ยธ.	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สท.	6611310	714,000.00	714,000.00	714,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค.66	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดทั้งหมด/ ปัจจุบันไปถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
10	CX	CX00000384	ยส.	จัดซื้อหรือติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สท.	6611310	240,000.00	240,000.00	240,000.00	ยังไม่เริ่มงานในสัญญา	ทั้งหมด 4 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 ม.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 ม.ค.67
11	CX	CX00000385	ยส.	จัดซื้อหรือติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สท.	6611310	124,500.00	124,500.00	124,500.00	ยังไม่เริ่มงานในสัญญา	ทั้งหมด 4 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 ม.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 ม.ค.67
12	CX	CX00000386	ยส.	จัดซื้อหรือติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สท.	6611310	44,814.00	44,814.00	44,814.00	ยังไม่เริ่มงานในสัญญา	ทั้งหมด 4 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 ม.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 ม.ค.67
13	CX	CX00000387	ยส.	จัดซื้อหรือติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการ สท.	6611310	170,000.00	170,000.00	170,000.00	ยังไม่เริ่มงานในสัญญา	ทั้งหมด 4 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 ม.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 ม.ค.67
14	CX	CX00000389	ยส.	ปรับปรุงสิ่งทีดสาร อาคารที่ทำการ สท.ขนาด 6 ชั้น 6 ชั้นนอก	6611320	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	ยังไม่เริ่มงานในสัญญา	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตั้งแต่ 17-23 ม.ค.67 กำหนดเสนอราคา 24 ม.ค.67
15	CX	CX00000391	ยส.	ติดตั้งเครื่องจักรระบบเสไฟฟ้าแรงสูง อาคารที่ทำการ สท. ทั่วมาก(แห่งใหม่) พร้อมทั้งพัก	6611320	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	9 พ.ย.66 - 4 ส.ค.67	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
16	CX	CX00000406	ยส.	ซ่อมแซมอาคารที่อาศัยอิฐระ สท. เลขที่ 96 และเลขที่ 52	6611200	4,742,000.00	4,742,000.00	4,742,000.00	5 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	- ตรวจรับงานแล้ว - อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย กรมบัญชีกลาง
17	CX	CX00000407	ยส.	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รัง ๓๓.	6611200	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	20 ธ.ค.66 - 17 ม.ค.67	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
18	CX	CX00000408	ยส.	งานสำรวจงานกายภาพและตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง อาคาร 1 ต.ร.	6611200	970,000.00	970,000.00	970,000.00	10 ม.ค.67 - 8 พ.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
19	CX	CX00000365	สท.	โลโก้ระบบ ระดับ 4 แบบมีสื่อเลื่อน จำนวน 2 ชุด	6611310	4,360,000.00	247,542,514.00	4,360,000.00	1 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการส่งสินค้า	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา	
20	CX	CX00000394	สท.	อาคารซึ่งมีมิกกิบ (โครง) จำนวน 4 รายการ	6611310	1,441,718.00	1,441,718.00	1,441,718.00		อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามรายการกำหนด	-อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อและขออนุมัติจัดซื้อใหม่ ลง 8 พ.ย.66 -อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค.66	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 31 ต.ค.66)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
21	CX	CX00000395	สพ.	อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (เครื่องบิน) จำนวน 4 รายการ	6611310	642,000.00	642,000.00	642,000.00		อยู่ระหว่างอนุมัติยกเลิก การประกวดราคาเบื้องต้นจากผู้ ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอไม่ ตรงตามรายการกำหนด	-อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อและขอ อนุมัติจัดซื้อใหม่ ลง 8 พ.ย.66 -อยู่ระหว่างจัดทำร่างTOR	
22	CX	CX00000396	สพ.	อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (เครื่องบิน) จำนวน 4 รายการ	6611310	24,605,002.00	24,605,002.00	24,605,002.00		อยู่ระหว่างอนุมัติยกเลิก การประกวดราคาเบื้องต้นจากผู้ ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอไม่ ตรงตามรายการกำหนด	-อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อและขอ อนุมัติจัดซื้อใหม่ ลง 8 พ.ย.66 -อยู่ระหว่างจัดทำร่างTOR	
23	CX	CX00000397	สพ.	รถยนต์ขับเคลื่อนกึ่งบรรทุก จำนวน 10 คัน	6611310	79,460,592.00	79,460,592.00	79,460,592.00	29 ก.ย.65 - 24 ก.ย.66	2 งวด	อยู่ระหว่างเปิดจ่าย	อยู่ระหว่างเปิดจ่าย งวดที่ 2
				รวม สพ. จำนวน 5 รายการ		110,509,312.00	110,509,312.00	110,509,312.00				
				รวม สพ. 23 รายการ		449,392,826.00	449,392,826.00	449,392,826.00				

รายการขอถอนเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี รอบ กันยายน 2566
 กรณีก่อนที่ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ภายใน 29 ก.ย.66
 ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 24 ม.ค.67

รายการ	กระทรวงการคลังอนุมัติ		เบิกจ่ายสะสม		เงินเหลือจาก การสลาย PO	มูลค่า PO คงเหลือ		หมายเหตุ
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		รายการ	จำนวนเงิน	
ใบสั่งซื้อจ้าง (PO)	2,176	7,575,535,882.73	-	-	480,336.00	227	*2,418,804,187.98	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
			1,803	988,965,714.77	1,329,378.94	146	*2,087,392,133.31	เบิกจ่ายบางส่วน/รอเบิกจ่ายต่อ
			1,803	2,076,737,424.81	1,826,706.92	-	-	เบิกจ่ายหมดแล้ว
			1,803	3,065,703,139.58	3,636,421.86	373	4,506,196,321.29	

*เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 29 มี.ค.67 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.67)

เปรียบเทียบ

รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566

ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำแนกเป็นรายหน่วย

ลำดับ	หน่วย	ประชุมเดือน พ.ย.66		ประชุมเดือน ม.ค.67		ลดลง	
		คงเหลือ		คงเหลือ			
		รก.	เงิน	รก.	เงิน	รก.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		1,440	7,047,056,015.47	373	4,506,196,321.29	- 1,067	- 2,540,859,694.18
1	สท.	4	2,972,215.00	0	0.00	-4	-2,972,215.00
2	สง.ก.ต.ช.	1	496,000.00	0	0.00	-1	-496,000.00
3	บ.ตร.	14	612,702,773.38	1	360,110,979.21	-13	-252,591,794.17
4	สยศ.ตร.	34	8,842,612.68	0	0.00	-34	-8,842,612.68
5	สกพ.	11	7,516,648.13	4	5,111,028.75	-7	-2,405,619.38
6	สงป.	1	211,646.00	0	0.00	-1	-211,646.00
7	กมค.	9	1,826,134.63	0	0.00	-9	-1,826,134.63
8	จต.	2	1,218,324.00	1	199,200.00	-1	-1,019,124.00
9	สตส.	10	1,936,304.12	3	884,993.10	-7	-1,051,311.02
10	บชน.	76	418,015,802.38	16	323,936,824.97	-60	-94,078,977.41
11	ภ.1	69	273,730,206.90	17	177,912,184.35	-52	-95,818,022.55
12	ภ.2	70	183,651,386.11	9	126,424,648.81	-61	-57,226,737.30
13	ภ.3	142	228,401,545.47	21	168,497,693.39	-121	-59,903,852.08
14	ภ.4	76	209,033,919.85	22	157,247,385.97	-54	-51,786,533.88
15	ภ.5	83	297,538,966.65	41	200,401,992.36	-42	-97,136,974.29
16	ภ.6	41	143,342,416.34	10	111,430,230.00	-31	-31,912,186.34
17	ภ.7	41	142,700,551.50	21	93,214,899.45	-20	-49,485,652.05
18	ภ.8	58	123,330,471.84	17	93,087,213.70	-41	-30,243,258.14
19	ภ.9	122	407,782,402.32	23	229,357,350.00	-99	-178,425,052.32
20	บช.ทท.	30	88,981,590.39	12	59,321,581.20	-18	-29,660,009.19
21	บช.ก.	58	155,700,090.26	21	104,097,064.48	-37	-51,603,025.78
22	บช.สอท.	25	140,109,067.45	9	96,617,029.20	-16	-43,492,038.25
23	บช.ปส.	11	19,553,104.00	1	1,627,470.00	-10	-17,925,634.00
24	บช.ส.	16	148,524,441.40	7	135,995,593.90	-9	-12,528,847.50

ลำดับ	หน่วย	ประชุมเดือน พ.ย.66		ประชุมเดือน ม.ค.67		ลดลง	
		คงเหลือ		คงเหลือ			
		รก.	เงิน	รก.	เงิน	รก.	เงิน
25	สทม.	2	18,815,500.00	1	10,769,600.00	-1	-8,045,900.00
26	บช.ตชด.	122	397,085,920.46	33	143,378,807.89	-89	-253,707,112.57
27	สพฐ.ตร.	49	60,216,024.96	1	11,927,240.62	-48	-48,288,784.34
28	สทส.	31	515,138,393.79	12	388,822,364.50	-19	-126,316,029.29
29	บช.ศ.	38	45,440,887.28	11	36,384,584.48	-27	-9,056,302.80
30	รร.นรด.	15	44,195,359.91	2	5,072,756.80	-13	-39,122,603.11
31	รพ.ตร.	17	2,880,198.92	5	1,485,918.71	-12	-1,394,280.21
32	สกบ.	162	2,345,165,109.35	52	1,462,879,685.45	- 110	- 882,285,423.90
	อก.สกบ.	9	3,495,209.35	0	0.00	-9	-3,495,209.35
	พธ.	49	581,370,803.55	10	109,936,117.20	-39	-471,434,686.35
	ยธ.	82	905,013,403.20	26	653,670,618.00	-56	-251,342,785.20
	สพ.	22	855,285,693.25	16	699,272,950.25	-6	-156,012,743.00

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMIS Thai

สถานะรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566

ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 227 รายการ + รอเบิกจ่ายต่อ จำนวน 146 รายการ รวมจำนวน 373 รายการ จำแนกเป็นรายหน่วย

ลำดับ	หน่วย	จำนวนทั้งสิ้น (1)		เบิกจ่าย (2)		เหลือจ่าย (3)	คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (4)=(1)-(2)-(3)	
		รก.	เงิน	รก.	เงิน	เงิน	รก.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		2,176.00	7,575,535,882.73	1,803	3,065,703,139.58	3,636,421.86	373	4,506,196,321.29
1	สท.	5	3,233,830.00	5	3,233,830.00	0.00	0	0.00
2	สง.ก.ต.ช.	1	496,000.00	1	496,000.00	0.00	0	0.00
3	บ.ตร.	24	661,167,009.41	23	301,056,030.20	0.00	1	360,110,979.21
4	สยศ.ตร.	46	12,601,255.93	46	12,601,255.93	0.00	0	0.00
5	สกพ.	14	8,188,548.13	10	3,077,519.38	0.00	4	5,111,028.75
6	สงป.	5	831,744.53	5	831,744.53	0.00	0	0.00
7	กมค.	14	2,520,630.40	14	2,520,630.40	0.00	0	0.00
8	จต.	2	1,218,324.00	1	1,019,124.00	0.00	1	199,200.00
9	สตส.	10	1,936,304.12	7	1,051,311.02	0.00	3	884,993.10
10	บชน.	144	428,888,210.24	128	104,934,385.27	17,000.00	16	323,936,824.97
11	ภ.1	92	285,856,454.11	75	107,764,587.09	179,682.67	17	177,912,184.35
12	ภ.2	108	197,195,380.80	99	70,762,731.99	8,000.00	9	126,424,648.81
13	ภ.3	218	253,498,206.04	197	83,779,310.29	1,221,202.36	21	168,497,693.39
14	ภ.4	220	242,606,126.75	198	85,357,303.28	1,437.50	22	157,247,385.97
15	ภ.5	115	318,116,068.25	74	117,455,788.78	258,287.11	41	200,401,992.36
16	ภ.6	73	171,342,958.05	63	59,912,728.05	0.00	10	111,430,230.00
17	ภ.7	68	157,771,664.35	47	62,779,634.49	1,777,130.41	21	93,214,899.45
18	ภ.8	87	129,793,247.23	70	36,597,403.48	108,630.05	17	93,087,213.70
19	ภ.9	161	566,452,181.24	138	337,029,779.48	65,051.76	23	229,357,350.00
20	บช.ทท.	59	115,861,136.08	47	56,539,554.88	0.00	12	59,321,581.20
21	บช.ก.	93	161,735,039.87	72	57,637,975.39	0.00	21	104,097,064.48
22	บช.สอท.	25	140,109,067.45	16	43,492,038.25	0.00	9	96,617,029.20
23	บช.ปส.	21	79,420,913.70	20	77,793,443.70	0.00	1	1,627,470.00
24	บช.ส.	17	148,689,310.21	10	12,693,716.31	0.00	7	135,995,593.90
25	สทม.	10	18,911,337.50	9	8,141,737.50	0.00	1	10,769,600.00
26	บช.ตชด.	153	420,962,847.90	120	277,584,040.01	0.00	33	143,378,807.89
27	สพฐ.ตร.	90	67,385,371.21	89	55,458,130.59	0.00	1	11,927,240.62
28	สทส.	37	525,588,223.12	25	136,765,859	0.00	12	388,822,364.50
29	บช.ศ.	64	59,274,948.73	53	22,890,364.25	0.00	11	36,384,584.48
30	รร.นรด.	20	45,755,459.91	18	40,682,703.11	0.00	2	5,072,756.80
31	รพ.ตร.	18	2,962,974.12	13	1,477,055.41	0.00	5	1,485,918.71
32	สกกบ.	162	2,345,165,109.35	110	882,285,423.90	0.00	52	1,462,879,685.45
	อก.สกกบ.	9	3,495,209.35	9	3,495,209.35	0.00	0	0.00
	พธ.	49	581,370,803.55	39	471,434,686.35	0.00	10	109,936,117.20
	ยธ.	82	905,013,403.20	56	251,342,785.20	0.00	26	653,670,618.00
	สพ.	22	855,285,693.25	6	156,012,743.00	0.00	16	699,272,950.25

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	5100001667	บ.ตร.	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรมช่าง ปีงบประมาณ 2566	6611310	950,000,000.00	360,110,979.21	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66		เบิกจ่ายแล้วจำนวน = 45,420,321.93 บาท	เบิกจ่าย 583,710,484.12 เหลือ 366,289,515.88
			รวม บ.ตร. จำนวน 1 รายการ		950,000,000.00	360,110,979.21				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมีใบ รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่งบบุ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดทั้งหมด/ปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100061537	สก.	กองสแกนพร้อมอุปกรณ์	6611310	330,000.00	330,000.00	5 ก.ค.66/2 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาส่งมอบ จำนวน 30 วัน	ตรวจรับแล้ว
	4100061537	สก.	บิลด์โค้ด	6611310	793,500.00	793,500.00	5 ก.ค.66/2 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาส่งมอบ จำนวน 30 วัน	บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนด ยินยอมจ่ายค่าปรับโดยไม่แจ้งเงื่อนไข สก. จึงขอตัดหรือวันที่ 30 ม.ค.67 เพื่อหาข้อสรุปต่อไป
	4100061537	สก.	แท่นยางสำหรับฝึกตี	6611310	9,000.00	9,000.00	5 ก.ค.66/2 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาส่งมอบ จำนวน 30 วัน	ตรวจรับแล้ว
2	4100066876	สก.	ค่าจ้างปรับปรุงถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ หลังกา อาคาร 1 ถึงอาคาร 9 งวดที่ 1-2	6611320	1,345,098.75	1,345,098.75	9 ส.ค.66/4 ก.พ.67	2 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างขออนุมัติเพิ่ม - ลดงาน เนื่องจากตรวจสอบหน้างานมีความคลาดเคลื่อนจากแบบรูปรายการ
3	4100079006	สก.	ค่าจ้างปรับปรุงระบอบความปลอดภัย ไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 3 (สนามรักบี้)	6611320	494,500.00	494,500.00	19 ก.ย.66/17 ธ.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกไปยัง กง.
4	4100079170	สก.	จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมการจ่าย กระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4-13 อาคาร บ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)	6611320	2,138,930.00	2,138,930.00	21 ก.ย.66/18 มี.ค.67	10 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
			รวม สกพ. จำนวน 4 รายการ		5,111,028.75	5,111,028.75				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าพึงใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100077237	จต.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การตรวจราชการออนไลน์ (JIS)	6611310	498,000.00	199,200.00	16ก.ย.66/13 ม.ค.67	มีทั้งหมดจำนวน 3 งวด ส่งเบิกงวดที่ 1 ผู้รับจ้างได้รับเงินเมื่อ 1 ธ.ค. 66, ส่งเบิกงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการของ กง.ตร.	อยู่ระหว่างตรวจรับใน GFMS	ตรวจรับงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อ 18 ม.ค.67 กำลังดำเนินการจัดทำเอกสารส่งเบิกไปที่ กง.ตร.
รวม จต. จำนวน 1 รายการ					498,000.00	199,200.00				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100082691	สตส.	คำซ่อมแซมหลังคาบ้านพัสดุระ สตส. (แฟลต บ.ตร.)	6611320	304,393.60	304,393.60	8 ก.ค.66/6 ส.ค.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
2	4100081804	สตส.	เครื่องพอกอากาศ 2 เครื่อง	6611310	93,999.50	93,999.50	25 ก.ย.66 / 25 ม.ค.67	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
3	4100082691	สตส.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	6611310	256,000.00	256,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
	4100082691	สตส.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	6611310	76,000.00	76,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
	4100082691	สตส.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	6611310	32,000.00	32,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
	4100082691	สตส.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่2	6611310	54,000.00	54,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
	4100082691	สตส.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6611310	24,600.00	24,600.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
	4100082691	สตส.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer)	6611310	16,000.00	16,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
	4100082691	สตส.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6611310	8,000.00	8,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
	4100082691	สตส.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6611310	20,000.00	20,000.00	25 ก.ย.66 / 9 พ.ย.66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินในทาง กง.เรียบร้อยแล้ว
			รวม สตส. จำนวน 3 รายการ		884,993.10	884,993.10				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100030950	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6	26,808,000.00	6,702,000.00	20 ก.ย.64 - 8 มิ.ย.68	จำนวนงวดงานทั้งหมด 15 งวด ปัจจุบันเบิกถึงงวดที่ 13	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างงวดที่ 15 และ 15
2	4100038858	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัว บก.สพ.พ. 1 หลัง	5,892,100.00	953,210.50	17 ส.ค.64 - 8 ก.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 20 งวด ปัจจุบันเบิกถึงงวดที่ 12	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ทำหนังสือเชิญประชุม ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดงานก่อสร้าง
3	4100038868	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	24,264,400.00	16,077,150.00	12 ต.ค.65 - 17 ก.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 15 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 4	เร่งรัดการก่อสร้างและสงวนสิทธิ ตามสัญญาครั้งที่ 2	จัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดการก่อสร้างต่อผู้รับจ้าง
4	4100038878	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศฝร.บข.น. จำนวน 4 หลัง	44,068,400.00	35,888,700.00	11 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 66 (360 วัน) อยู่ระหว่างบริษัทฯ ขอลดหรือ งวดค่าปรับ	จำนวนงวดงานทั้งหมด 9 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 3	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	ปัจจุบันหยุดก่อสร้างชั่วคราว (เนื่องจากคนรักรั่ว) รอผลการตรวจสอบจากฝ่ายโยธา
5	4100045278	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัว บก.สพ.พ. 1 หลัง	5,892,000.00	5,892,000.00	17 ส.ค.64 - 8 ก.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 20 งวด ปัจจุบันเบิกถึงงวดที่ 12	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ทำหนังสือเชิญประชุม ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดงานก่อสร้าง
6	4100045280	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	4,735,600.00	4,735,600.00	12 ต.ค.65 - 17 ก.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 15 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 4	เร่งรัดการก่อสร้างและสงวนสิทธิตามสัญญาครั้งที่ 2	จัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดการก่อสร้างต่อผู้รับจ้าง
7	4100045282	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศฝร.บข.น. จำนวน 4 หลัง	39,159,300.00	39,159,300.00	12 ต.ค.65 - 6 ต.ค.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 9 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 3	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา - แจ้งค่าปรับ /คก.ตรวจรับอยู่ระหว่างการประชุมเจรจาเร่งรัดค่าปรับ	ปัจจุบันหยุดก่อสร้างชั่วคราว (เนื่องจากคนรักรั่ว) รอผลการตรวจสอบจากฝ่ายโยธา
8	4100056225	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลัง (หญิง) 2 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	27,760,000.00	27,760,000.00	1 ก.ค.66 - 24 มิ.ย.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 9 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ตรวจรับงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2
9	4100068243	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม บข.น. จำนวน 1 หลัง	71,990,000.00	64,791,000.00	360 วัน (ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่)		อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ และแจ้งให้เริ่มงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าขังไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันยังไม่ได้เบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
10	4100069231	บข.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด บก.อก.บข.น. จำนวน 10 คัน	8,490,000.00	8,490,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน/ปัจจุบันยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 14 ก.พ.67 อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา
	4100069231	บข.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด บก.คส.บข.น. จำนวน 5 คัน	4,245,000.00	4,245,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน/ปัจจุบันยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 14 ก.พ.67 อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา
	4100069231	บข.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สบ.ปทุมวัน จำนวน 5 คัน	4,245,000.00	4,245,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน/ปัจจุบันยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 14 ก.พ.67 อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา
	4100069231	บข.น.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด กก.น้ำตำรวจ บก.สบพ. จำนวน 3 คัน	2,547,000.00	2,547,000.00	19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน/ปัจจุบันยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ วันที่ 14 ก.พ.67 อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา
11	4100070404	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ศส.บข.น. จำนวน 1 หลัง	32,050,000.00	32,050,000.00	27 ก.ย.66 - 20 ก.ย.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 11 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 1	พิจารณาแผนการทำงาน / บุคลากร	ตรวจรับงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2
12	4100081731	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.สส.บข.น.8 จำนวน 1 หลัง	58,000,000.00	58,000,000.00	270 วัน (ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่)		อยู่ระหว่าง ตก.ตรวจรับแจ้งให้เริ่มงานตามสัญญา	ส่งมอบพื้นที่ 29 พ.ย.66 อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ก่อสร้าง

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าพึงไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
13	4100081738	บข.น.	งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติ ชั้น 3 บข.น. จำนวน 1 งาน	5,990,000.00	4,193,000.00	13 ต.ค.66 - 29 เม.ย.67	งานมีทั้งหมด 4 งวด / ปัจจุบันเบิกไปแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3
14	4100074777	บข.น.5	คำสั่งปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.สส.บข.น.5	3,307,614.47	3,307,614.47	12 ก.ย.66 - 10 ธ.ค.66	จำนวน 2 งวดงาน/ปัจจุบันยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ	ขอขยายระยะเวลาส่งมอบพัสดุ เนื่องจากมีการปรับแบบ อยู่ระหว่าง ยธ. ปรับแบบสัญญา
15	4100051613	บข.น.9	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย บข.น.9 (แฟลตบางแค)	12,500,000.00	3,750,000.00	1 พ.ค.66 - 25 มี.ค.67	จำนวน 9 งวดงาน /ส่งมอบงาน งวดที่ 5 เมื่อ 5 ม.ค.67 คงเหลืออีก 4 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 4	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 6 ก่อสร้างงวดที่ 7
16	4100076068	บข.สปพ.	ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสนามยิงปืน กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บข.สปพ.	4,601,000.00	1,150,250.00	12 ก.ย.66-10 ม.ค.67	งวดงานทั้งหมด 5 งาน 9 งวด / เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด คงเหลือ 7 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส่งงวดงานครบแล้ว วันที่ 12 ม.ค.67 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.67
			รวม บข.น. จำนวน 16 รายการ	386,545,414.47	323,936,824.97				

รายงานรายการ ในสิ่งก่อสร้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เกินเดือนมีนาคม 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนวงจรรวมค/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100039860	ภ.จว.สมุทรปราการ	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว สก.บางพลีน้อย	6611320	18,802,040.00	15,229,652.40	20 ม.ค.66-10 มี.ย.67	จำนวนวงจรรวมทั้งหมด 11 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 3	ก่อสร้างงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5
2	4100039862	ภ.จว.สมุทรปราการ	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว สก.บางแก้ว	6611320	18,723,271.60	15,165,849.99	20 ม.ค.66-23 พ.ค.67	จำนวนวงจรรวมทั้งหมด 11 งวดงาน/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 3	ก่อสร้างงวดงานที่ 2 และ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5
3	4100045085	ภ.จว.นนทบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) ขนาด 30 ครอบครัว สก.บางกรวย	6611320	21,830,000.00	12,224,800.00	29 เม.ย. 66 -22 เม.ย.67	จำนวนวงจรรวม 11/เบิกจ่ายงวดที่ 1-6 เรียบร้อย	ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 7
4	4100045428	ภ.จว.ปทุมธานี	อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว สูง 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง,บันไดกลาง) สก.ปากคลองรังสิต	6611320	24,960,000.00	8,985,600.00	9 มี.ค.66-10 มี.ย.67	จำนวนวงจรรวมทั้งหมด 10 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 7	คณะกรรมการตรวจรับงานงวด 5 วันที่ 31 ต.ค.66	กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8
5	4100047613	ภ.จว.ปทุมธานี	อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว สูง 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง,บันไดกลาง) สก.ธัญบุรี	6611320	24,980,000.00	8,992,800.00	24 มี.ค.66-25มี.ย.67	จำนวนวงจรรวมทั้งหมด 10 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 7	คณะกรรมการตรวจรับงานงวด 5 วันที่ 31 ต.ค.66	กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8
6	4100061341	ภ.จว.ปทุมธานี	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ(191) ภ.จว.ปทุมธานี	6611320	15,400,000.00	10,472,000.00	5 ก.ค.66-23ก.ย.67	จำนวนวงจรรวมทั้งหมด 9 งวดงาน / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 4	คณะกรรมการตรวจรับงานงวด 1 วันที่ 31 ต.ค.66	กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5
7	4100044109	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.บางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6611320	21,847,000.00	10,705,030.00	24 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 67 ขยายเวลา 42 วัน ถึง 31 มี.ค.67	จำนวนวงจรรวมทั้งหมด 10 งวดงาน/ เบิกจ่ายงวดที่ 1-6 เรียบร้อย	ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 7
8	4100046622	ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.อุทัย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6611320	39,236,000.00	18,440,920.00	16 มี.ค. 66 - 7 มี.ย. 67	จำนวนวงจรรวมทั้งหมด 13 งวดงาน/ เบิกจ่ายงวดที่ 1-8 เรียบร้อย	ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 9
9	4100064766	ภ.จว.อำนาจทอง	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๑๑ ของ ภ.จว.อำนาจทอง	6611320	13,180,000.00	5,272,000.00	26 ก.ค.66 - 19 มี.ย.67 (330 วัน)	จำนวนวงจรรวม 8 งวดงาน/ เบิกจ่าย 1-6 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 7
10	4100047373	ภ.จว.ลพบุรี	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครั้งเรือน สก.ท่าหลวง จว.ลพบุรี	6611320	21,577,000.00	4,962,710.00	เริ่ม 24 พ.ค.66 สิ้นสุด 18 พ.ค.67	จำนวนวงจรรวม 11/เบิกจ่ายงวดที่ 1-9 เรียบร้อย	นัดตรวจรับงานงวดที่ 6/11 วันที่ 9 พ.ย.66	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 10
11	4100065187	ภ.จว.ลพบุรี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลพบุรี	6611320	12,370,000.00	8,670,264.12	เริ่ม 4 ส.ค.66 สิ้นสุด 28 มี.ย.67	จำนวนวงจรรวม 8/เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 เรียบร้อย	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2/8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
12	4100044015	ภ.จว.สิงห์บุรี	งานปรับปรุงถนนหน้าอาคารที่ทำการ สก. อินทร์บุรี	6611320	23,740,000.00	2,050,444.46	เริ่ม 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 26 พ.ค.67	จำนวนงวดงาน 1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิก	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากนำไปรวมเป็นสัญญาเดียวกับโครงการเฟลต 5 ชั้น สก.อินทร์บุรี อยู่ในงวดงานที่ 11
13	4100066520	ภ.จว.สิงห์บุรี	ก่อสร้างเฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุค สก. อินทร์บุรี	6611320	13,470,000.00	9,107,355.54	เริ่ม 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 26 พ.ค.67	จำนวนงวดงาน 11/เบิกจ่ายงวดที่ 1-7 เรียบร้อย	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8
14	4100066318	ภ.จว.ชัยนาท	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ(191) ภ.จว.สิงห์บุรี	6611320	14,310,000.00	9,553,050.00	เริ่ม 27 ก.ค. 66 สิ้นสุด 21 มิ.ย. 67	จำนวนงวดงาน 8/เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 เรียบร้อย	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4
15	4100063899	ภ.จว.ชัยนาท	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ(191) ภ.จว.ชัยนาท	6611320	14,310,000.00	11,448,000.00	4 ส.ค.66 - 28 มิ.ย.67 (330 วัน)	จำนวนงวดงานทั้งหมด8งวด/เบิกงวด1 และ2เรียบร้อย	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 3และ4
16	4100071869	ภ.จว.สระบุรี	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดใหญ่)สก.หนองแค จว.สระบุรี งวด 5-13	6611320	31,874,150.00	20,221,002.84	27 ก.พ. 66 - 22 เม.ย. 66 (420 วัน)	จำนวนงวดงาน 13 งวดงาน/ เบิกจ่ายงวดที่ 1 - 7 เรียบร้อย	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8
17	4100051441	ศพร.ภ.1	คำจ้างเหมาติดตั้งชุดเครื่องแบบสนามจราจร สก.แม่จตุร	6611230	21,000.00	21,000.00	29 ส.ค. 66 - 27 ก.ย. 66	จำนวน 1 งวดงาน /เบิกจ่ายเรียบร้อย	เบิกจ่ายเรียบร้อย	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
			ก่อสร้างเฟลต 5 ชั้น งวด 6-11	6611320	21,478,000.00	6,389,705.00	19 เม.ย.66-13 เม.ย.67	11 งวดงาน 11 งวดเงินเบิกจ่ายงวดที่ 8 แล้ว	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7 /อยู่ระหว่างวางเบิกจ่ายงวดงานที่ 6	ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่9 เป็นไปตามระยะเวลาตามสัญญา
			รวม.ภ.1 จำนวน 17 รายการ		337,798,461.60	177,912,184.35				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100045422	ภ.จว.จันทบุรี	อาคารที่ทำการ ภ.จว.จันทบุรี	6611320	46,000,000.00	18,595,908.56	23 ธ.ค.65-16 ก.พ.67	10 งวดงาน/ เบิกถึงงวด 8	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 9-10
2	4100068959	ภ.จว.จันทบุรี	อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	13,580,000.00	12,364,020.25	17 ส.ค.66 - 12 ก.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวด 2	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3
3	4100070853	ภ.จว.ตราด	ก่อสร้างศูนย์191 (ขนาดเล็ก)	6611320	14,567,000.00	11,882,720.00	30 ส.ค.66-25 ก.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวด 2	งานฐานราก ดอกเส้าเข็ม	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3
4	4100043240	ภ.จว.ระยอง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดใหญ่) สก.บางปะกง	6611320	40,500,000.00	25,920,000.00	15 ก.พ.66 -11 มี.ค.67(ขยายถึง 8 มิ.ย.67)	13 งวดงาน/เบิกถึงงวด 5	งวดงานที่ 4 อยู่ระหว่างการตรวจรับ	อยู่ระหว่างตรวจรับงวด 6 และอยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 7
5	4100065719	ภ.จว.ระยอง	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,580,000.00	10,864,000.00	3 ส.ค.66 - 28 มิ.ย.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวด 2	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3
6	4100072245	ภ.จว.ปราจีนบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	6611320	14,365,000.00	14,365,000.00	31 ส.ค.2566 - 25 ก.ค.2567	8 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกเงินงวด 1 - 2 และอยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3
7	4100073709	ภ.จว.นครนายก	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	6611320	14,420,000.00	14,420,000.00	05 ก.ย. 2566-31 ก.ค.67	8 งวดงาน	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3
8	4100064769	ภ.จว.สระแก้ว	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ	6611320	13,340,000.00	10,672,000.00	26 ก.ค.66 - 19 ก.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวด 2(จำนวน PO คงเหลือ ต้องเป็นยอด 10,672,000	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3
9	4100035033	บก.ส.ภ.2	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.ส.ภ.2	6611320	48,940,000.00	7,341,000.00	1 ธ.ค.65 - 26 พ.ย.66	10 งวดงาน/ เบิกถึงงวด 7	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 8 - 10	อยู่ระหว่างเบิกเงินงวด 8 -10
			รวม ภ.2 จำนวน 9 รายการ		219,292,000.00	126,424,648.81				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100051440	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	3,729,375.00	3,729,375.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งหมด 48 งวดงาน เบิกจ่ายไป 35 งวด คงเหลือ 13 งวด	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	เบิกจ่ายถึงงวด ที่ 37 คงเหลือ 11 งวด
2	4100051442	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ	6611320		1,906,125.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งหมด 48 งวดงาน เบิกจ่ายไป 35 งวด คงเหลือ 13 งวด	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	เบิกจ่ายถึงงวด ที่ 37 คงเหลือ 11 งวด
3	4100051449	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	4,143,750.00	4,143,750.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งหมด 48 งวดงาน เบิกจ่ายไป 35 งวด คงเหลือ 13 งวด	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	เบิกจ่ายถึงงวด ที่ 37 คงเหลือ 11 งวด
4	4100051452	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	7,205,250.00	7,205,250.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งหมด 48 งวดงาน เบิกจ่ายไป 35 งวด คงเหลือ 13 งวด	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	เบิกจ่ายถึงงวด ที่ 37 คงเหลือ 11 งวด
5	4100051455	ภ.3	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ พร้อม ส่วนประกอบอื่นๆ	6611320	3,729,375.00	3,729,375.00	29 ก.ย.63-14 ส.ค.68	มีทั้งหมด 48 งวดงาน เบิกจ่ายไป 35 งวด คงเหลือ 13 งวด	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	เบิกจ่ายถึงงวด ที่ 37 คงเหลือ 11 งวด
6	4100048356	ภ.จว.นครราชสีมา	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.กลางดง	6611320	21,868,429.00	18,369,480.36	31 มี.ค.66 - 24 มี.ค.67	มีทั้งหมด 10 งวดงาน เบิกจ่ายไป 2 งวดงาน คงเหลือ 8 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เหลือ 8 งวด
7	4100056437	ภ.จว.นครราชสีมา	โครงการจ้างกองอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็กสร้าง) สภ.พลสงคราม	6611320	12,081,133.40	3,522,000.41	24 ก.พ.66 - 19 ม.ค.67	มีทั้งหมด 9 งวดงาน เบิกจ่ายไป 7 งวดงาน คงเหลือ 2 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด เหลือ 2 งวด
8	4100056456	ภ.จว.นครราชสีมา	โครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.สีสุก	6611320	11,586,692.97	3,378,160.41	10 ก.พ.66 - 5 ม.ค.67	มีทั้งหมด 9 งวดงาน อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย งวดที่8 และงวดที่9	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายสุดท้ายแล้ว
9	4100050775	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สถานีตำรวจภูธรโพธิ์สง ตำบล	6611320	29,200,000.00	21,900,000.00	25 เม.ย.66 - 16 ส.ค.67	มีทั้งหมด 16 งวดงาน ปัจจุบันเบิก กวดถึงงวดที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 6
10	4100050785	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สาราตรี - รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร	6611320	11,770,000.00	6,120,400.00	25 เม.ย.66 - 19 มี.ค.67	มีทั้งหมด 9 งวดงาน ปัจจุบันเบิก กวดถึงงวดที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 6-7
11	4100071621	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) จำนวน 1 หลัง ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์	6611320	13,670,000.00	9,569,000.00	2 ก.ย.66 - 27 ก.ค.67	มีทั้งหมด 8 งวดงาน ปัจจุบันเบิก กวดถึงงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4
12	4100077570	ภ.จว.สุรินทร์	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.จว.สุรินทร์	6611320	450,000.00	450,000.00	15ก.ย.66-13พ.ย.66	1 งวดงาน / ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1
13	4100078662	ภ.จว.สุรินทร์	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) สุรินทร์	6611320	12,890,000.00	11,601,000.00	15 ก.ย.66-9ส.ค.67	8 งวดงาน / เบิกงวดที่ 1 แล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ กวดงานที่1	ตรวจรับงานงวด 2 และงวด3 แล้ว รอเบิกงวด 2 และ 3
14	4100068512	ภ.จว.ศรีสะเกษ	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) จำนวน 1 หลัง ตำรวจภูธรศรีสะเกษ	6611320	12,497,000.00	12,497,000.00	15 ส.ค.66 10 ก.ค.67	8งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 1	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานอยู่ระหว่างงวด งานที่ 1	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 2

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าขังใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
15	4100061189	ภ.จว.อุบลราชธานี	โครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.อุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง	6611320	12,960,000.00	12,947,042.09	5 ก.ค.66 - 29 พ.ค.67	8 งวดงาน/ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
16	4100074060	ภ.จว.ยโสธร	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	11,686,000.00	9,348,800.00	5ก.ย.66-22มี.ค.67	8งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส่งเบิกงวดงานที่ 2 และจะตรวจรับงวดงานที่ 3-4
17	4100076197	ภ.จว.ยโสธร	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ชั้นประทวน สภ.ป่าดิว	6611320	7,975,757.00	4,464,900.00	28มี.ค.66-22ธ.ค.66	5งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จะส่งงวดงานที่ 4
18	4100081531	ภ.จว.ยโสธร	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานสืบสวน ห้องเก็บของกลาง สภ.กุดชุม	6611320	339,000.00	339,000.00	27ก.ย.66-11ธ.ค.66	มี 1 งวดงาน /ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 1
19	4100071203	ภ.จว.ชัยภูมิ	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,880,000.00	11,798,000.00	4 ก.ย.66 - 29 ก.ค.67	จำนวน 8 งวดงาน /เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวดงาน 331,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 4
20	4100067595	ภ.จว.อำนาจเจริญ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	14,790,000.00	12,574,500.00	11 ส.ค.66-6 ก.ค.66	8 งวดงาน /เบิกจ่าย 3 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4
21	4100081890	ศพร.ภ.3	ก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นห้องเรียน	6611320	9,239,000.00	8,907,535.12	29 ก.ย.66 - 4 ก.ค.67	7 งวดงาน/ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
			รวม ภ.3 จำนวน 21 รายการ		215,690,762.37	168,497,693.39					

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100046505	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกค.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,599,900.00	1,599,900.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	จำนวนทั้งหมด 10 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) งวดงานที่ 6 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2	4100046507	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกค.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,439,910.00	1,439,910.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	จำนวนทั้งหมด 10 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) งวดงานที่ 7 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
3	4100046509	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกค.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,919,880.00	1,919,880.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	จำนวนทั้งหมด 10 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) งวดงานที่ 8 อยู่ระหว่างส่งมอบ
4	4100046511	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกค.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	2,399,850.00	2,399,850.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	จำนวนทั้งหมด 10 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) งวดงานที่ 9 อยู่ระหว่างส่งมอบ
5	4100046513	ภ.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกค.-รอง ผบก.ภ.4 จำนวน 9 หลัง	6611320	1,919,880.00	1,919,880.00	16 มี.ค.66 - 8 ก.พ.67	จำนวนทั้งหมด 10 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 65%	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) งวดงานที่ 10(งวดสุดท้าย) อยู่ระหว่างส่งมอบ
6	4100046538	ภ.4	จ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว บก.อก.ภ.4	6611320	3,492,000.00	3,492,000.00	16 มี.ค.66 - 7 มิ.ย.67	จำนวนทั้งหมด 11 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 9	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 69%	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดงานที่ 10-11(งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 15 ก.พ.67
7	4100046539	ภ.4	จ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว บก.อก.ภ.4	6611320	4,074,000.00	4,074,000.00	16 มี.ค.66 - 7 มิ.ย.67	จำนวนทั้งหมด 11 งวด เบิกจ่ายถึงงวดที่ 9	ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 69%	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดงานที่ 10-11(งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 15 ก.พ.67
8	4100060596	ภ.จว.หนองบัวลำภู	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ก.จว.หนองบัวลำภู	6611320	13,200,000.00	9,240,000.00	30 มิ.ย.66 - 25 พ.ค.2567	จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงาน เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 3 งวดงาน	ตรงรับแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4
9	5100003372	ภ.จว.อุดรธานี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191	6611320	18,950,000.00	12,162,875.87	24 มิ.ย.66- 18 พ.ค.67	มีทั้งหมด 8 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างงวดงาน 5-6
10	4100051400	ภ.จว.เลย	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประถวน รอง สว. 10 คูหา สก.นาแห้ว	6611320	8,960,000.00	4,928,000.00	27 เม.ย.2566-23 ต.ค. 2566 (ขยายสัญญาถึง 7 มี.ค. 67)	มีทั้งหมด 5 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างส่งมอบ เบิกจ่ายงวดงาน 1-2	ปัจจุบันอยู่รอดงานที่ 4
11	4100074020	ภ.จว.เลย	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (191)	6611320	13,789,000.00	13,789,000.00	8 ก.ย.2566-3 ต.ค. 2567	มีทั้งหมด 8 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปัจจุบันอยู่รอดงานที่ 4
12	4100067799	ภ.จว.หนองคาย	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ (191)	6611320	13,165,500.00	13,165,500.00	08/08/2566-02/07/2566	มีทั้งหมด 8 งวดงาน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวด 1-2	นัดตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 7 พ.ย. 2566	หน้างานอยู่รอดงานที่ 3
13	4100072793	ภ.จว.มหาสารคาม	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม	6611320	13,200,789.00	11,880,710.10	06/09/2566-31/07/2567	ทั้งหมด 8 งวด เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2
14	4100048600	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประถวน - รอง สว. 1 คูหา 10 ห้อง สก.บ้านบัวขาว	6611320	9,420,000.00	3,297,000.00	27 มีนาคม 2566 - 22 ธันวาคม 2566	ทั้งหมด 5 งวด เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 4 แล้ว	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3-4 มีทั้งหมด 5 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันไปถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
15	4100048608	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างเรือมอเนอวขึ้นประทวน - รอง สว 1 คูหา 10 ห้อง สก.โพมทราย	6611320	9,500,000.00	3,325,000.00	27 มีนาคม 2566 - 22 ธันวาคม 2566	ทั้งหมด 5 งวด เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 4 แล้ว	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด ที่ 3-4 มีทั้งหมด 5 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5
16	4100063663	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ก.จว.ร้อยเอ็ด	6611320	13,370,000.00	13,370,000.00	17 กรกฎาคม 2566 - 11 กรกฎาคม 2567	ทั้งหมด 10 งวด เบิกจ่ายไปแล้วงวดที่ 1 ส่วนงวดงานที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 3 ถึงงวดงานที่ 10
17	4100074989	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างห้องมอเนอวบนบประสงฆ์ ภ.จว.ร้อยเอ็ด	6611320	2,500,000.00	1,750,000.00	12 กันยายน 2566 - 10 มกราคม 2567	ทั้งหมด 4 งวด เบิกจ่าย งวดที่ 1 - 2 แล้ว	ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 3 ที่ 4
18	4100065752	ภ.จว.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์	6611320	14,239,000.00	14,239,000.00	5 ส.ค.66-29 มิ.ย.67	ทั้งหมด 8 งวด อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปัจจุบันกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 2
19	4100073280	ภ.จว.นครพนม	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ขนาดเล็ก ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม	6611320	12,650,000.00	11,385,000.00	7 ก.ย.66 - 1 ส.ค.67	ทั้งหมด 8 งวดงาน เบิกจ่ายงวดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานที่ 1	กำลังดำเนินการในงวดงานที่ 2 ถึงงวดงานที่ 3
20	4100060426	ภ.จว.มุกดาหาร	ติดตั้งเครื่องแบบสนามสำหรับงานจราจร	6611320	12,940,000.00	9,058,000.00	29 มิ.ย. 66 - 24 พ.ค. 67	1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21	4100073427	ภ.จว.บึงกาฬ	ก่อสร้างศูนย์ 191 แห่งชาติ ภ.จว.บึงกาฬ	6611320	16,100,000.00	16,100,000.00	7 ก.ย.66 - 1 ส.ค.67	ทั้งหมด 8 งวด ยังไม่เบิกจ่าย(อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1)	ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานที่ 1	กำลังดำเนินการในงวดงานที่ 2
22	4100077986	ศฝร.ภ.4	จ้างก่อสร้างสิ่งเสริมร้านค้าสวัสดิการตำรวจ ศฝร.ภ.4	6611320	3,600,000.00	2,711,880.00	20 ก.ย.66 ถึง 16 เม.ย.67	จำนวน 6 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน	กำลังดำเนินการในงวดงานที่ 1	กำลังดำเนินการในงวดงานที่ 2 และ 3
			รวม ภ.4 จำนวน 22 รายการ		192,429,709.00	157,247,385.97				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมดปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
1	4100046401	ภ.5	อาคารแพตล 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุค สก. พนท.ภ.จว.เชียงราย	6611320	25,720,000.00	19,032,800.00	15 มี.ค.66 -21 เม.ย.67	งวดที่ 4/11	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3 และ งวดที่ 4	ประชุมเดือน พ.ย.66	ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
2	4100054394	ภ.5	อาคารที่ทำการ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5	6611320	28,390,000.00	19,873,000.00	11 พ.ค.66 -4 ก.ค.67	งวดที่ 4/10	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1		อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 5
3	4100059793	ภ.5	อาคารประชุมและสัมมนา 300 ที่นั่ง ภ.จว. เชียงราย	6611320	7,600,000.00	461,748.40	23 มิ.ย.66 -2 ก.ย.67	งวดที่ 3/10	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3		อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4
4	4100061187	ภ.5	อาคารแพตล 5 ชั้น 40 ครอบครัวยุค สก.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา	6611320	29,680,000.00	17,077,820.83	9 มี.ค.66 -28 มี.ค.67	งวดที่ 6/11	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 5 และ งวดที่ 6		อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 7
5	4100073731	ภ.5	อาคารแพตล 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุค สก.เมืองแม่ฮ่องสอน	6611320	25,043,000.00	18,991,016.40	8 เม.ย.66 -13 พ.ค.67	งวดที่ 6/11	เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว		อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 7
6	4100073747	ภ.5	อาคารแพตล 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุค สก.ปพ.บก.สส.ภ.5	6611320	24,072,000.00	13,817,204.94	16 พ.ค.66 -27 มิ.ย.67	งวดที่ 6/11	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1 และ งวดที่ 2		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 7
7	4100075178	ภ.จว.เชียงใหม่	เรือนแถว ซับประทวน-รอง สว. 10 คูหา สก.จอมทอง	6611320	8,945,900.00	7,604,015.00	24 ม.ค. 66 - 21 เม.ย. 67	งวดที่ 1/5	อยู่ระหว่างอนุมัติพัสดุราคาขึ้นคืน		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 2
8	4100075229	ภ.จว.เชียงใหม่	เรือนแถว ซับประทวน-รอง สว. 10 คูหา สก.ไชยปราการ	6611320	9,460,000.00	6,622,000.00	21 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	งวดที่ 2/5	อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 1 และ งวดที่ 2		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 3
9	4100075236	ภ.จว.เชียงใหม่	เรือนแถว ซับประทวน-รอง สว. 10 คูหา สก.ฝาง	6611320	9,478,000.00	6,634,600.00	21 ม.ค. 66 - 27 มี.ค. 67	งวดที่ 2/5	อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 2		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 3
10	4100074980	ภ.จว.ลำพูน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,720,000.00	13,720,000.00	8 กันยายน 2566ถึง 3 สิงหาคม 2567		อยู่ระหว่างก่อสร้าง		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
11	4100070238	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	712,763.03	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67		อยู่ระหว่างก่อสร้าง		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
12	4100070240	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67		อยู่ระหว่างก่อสร้าง		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 2
13	4100070242	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67		อยู่ระหว่างก่อสร้าง		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 4
14	4100070245	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67		อยู่ระหว่างก่อสร้าง		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
15	4100070247	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	
16	4100070248	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,340,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	
17	4100070250	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	1,340,700.00	1,575,700.00	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	
18	4100070251	ภ.จว.ลำปาง	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ลำปาง	6611320	4,022,100.00	4,415,036.97	24 ส.ค.66 - 18 ก.ค.67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	
19	4100043815	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รong ศว. จำนวน 1 หลัง สก.ป่อเกลือ	6611320	1,894,000.00	1,894,000.00	22 ก.พ.66-7 ม.ค.67	งวดที่ 4/5	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ขยายสัญญาจ้างถึง 28 ม.ค.67
20	4100043818	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รong ศว. จำนวน 1 หลัง สก.ป่อเกลือ	6611320	3,314,500.00	3,178,586.79	22 ก.พ.66-7 ม.ค.67 (ขยายระยะเวลา)	งวดที่ 5/5	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ขยายสัญญาจ้างถึง 28 ม.ค.67
21	4100073959	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	งวดที่ 1/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
22	4100073963	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	งวดที่ 2/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
23	4100073967	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	งวดที่ 3/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
24	4100073969	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	งวดที่ 4/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
25	4100073971	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	งวดที่ 5/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
26	4100073976	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	งวดที่ 6/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
27	4100073977	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	1,460,820.00	1,460,820.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	งวดที่ 7/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
28	4100073978	ภ.จว.น่าน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.น่าน	6611320	4,382,460.00	4,382,460.00	9 ก.ย.66-3 ส.ค.67	งวดที่ 8/8	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
29	4100065083	ภ.จว.พะเยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน - แห่งชาติ (191)	6611320	15,780,000.00	11,046,000.00	26 ก.ค.66 - 20 ก.ค.67	8/3	อยู่ระหว่างส่งมอบ	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 3

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อนาม	ชื่อรายการ	แหล่งเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า (ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67))
30	4100062854	ภ.จว.เชียงใหม่	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประพวน-รองตาวัวตริ 10 คูหา สก.แม่สรวย	6611320	8,480,000.00	5,936,000.00	1 ก.พ.66 - 4 ก.พ.67	งวดที่ 2/5	อยู่ระหว่างส่งมอบ	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 3
31	4100076389	ภ.จว.เชียงใหม่	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการอาคาร ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	11,698,000.00	11,698,000.00	15 ก.ย.66 - 12 มี.ค.67	งวดที่ 1/2	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1
32	4100079314	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	740,000.00	740,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
33	4100079315	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	740,000.00	740,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
34	4100079318	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
35	4100079322	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
36	4100079326	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
37	4100079327	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
38	4100079329	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
39	4100079330	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
40	4100079334	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	1,480,000.00	1,480,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
41	4100079335	ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.แม่ฮ่องสอน	6611320	2,960,000.00	2,960,000.00	12 ก.ย.66 - 7 ส.ค.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 1
			รวม ภ.5 จำนวน 41 รายการ		273,907,100.00	200,401,992.36				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100073996	ภ.จ.อุดรธานี	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	6611320	13,383,354.87	10,925,600.00	19 ก.ค.66-13 มี.ย.67	8 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 3
2	4100070580	ภ.จ.นครสวรรค์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	12,340,000.00	12,340,000.00	3 ส.ค.66-28 มี.ย.66	8 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 0 งวด	อยู่ระหว่างรอกำหนดฐานราคาจาก ยศ.ร.	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1
3	4100081766	ภ.จ.สุโขทัย	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย	6611320	13,030,811.27	10,712,000.00	4 ส.ค. 66 ถึง 28 มี.ย. 67	8 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการงวดที่ 1-2	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 3
4	4100069918	ภ.จ.กำแพงเพชร	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จ.กำแพงเพชร	6611320	14,509,000.00	14,073,730.00	21 ส.ค.66-16 ก.ค.67	34 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
5	4100069302	ภ.จ.ตาก	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดตาก	6611320	13,270,000.00	9,289,000.00	21 ส.ค.66 - 16 ก.ค.67	8 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1-2	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 4
6	4100080932	ภ.จ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จ.สุโขทัย	6611320	12,940,000.00	12,940,000.00	20 ก.ย.66-15 ส.ค.67	8 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 0 งวด	อยู่ระหว่างรอกำหนดฐานราคาจาก ยศ.ร.	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1
7	4100082838	ภ.จ.สุโขทัย	ปรับถนนพื้นที่บริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191	6611220	240,000.00	240,000.00	28 ก.ย.66-15 ส.ค.67	8 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 0 งวด	รอการก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1
8	4100068921	ภ.จ.พิจิตร	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จ.พิจิตร	6611320	12,420,000.00	12,420,000.00	15 ส.ค.66-9 ส.ค.67	8 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 0 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1
9	4100048925	ภ.จ.เพชรบูรณ์	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประพยอม-รอง สว. 10 คูหา จำนวน 2 หลัง ภ.จ.เพชรบูรณ์	6611320	16,480,000.00	16,480,000.00	3 เม.ย.66-3 เม.ย.67	6 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 0 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 - 3	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1 - 4
10	4100064372	ภ.จ.เพชรบูรณ์	โครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์ 191) ภ.จ.เพชรบูรณ์	6611320	12,900,000.00	12,009,900.00	19 ก.ค.66-10 ก.ค.67	8 งวด / เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
			รวม ภ.6 จำนวน 10 รายการ		121,513,166.14	111,430,230.00				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี งบ ก้นยาน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มตั้งและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบัน/ถึงงวดงานที่ทำไว้ (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100060155	ภ.7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) และ โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม อาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรภาค 7 (แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))	6611310	7,600,000.00	7,600,000.00	26 มิ.ย.66 - 29 ธ.ค.66 (ขยายสัญญา 2 ม.ค.67 - 29 มิ.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ๗.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
2	4100060648	ภ.7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องประชุม อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 7 (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	1,490,000.00	1,490,000.00	30 มิ.ย.66 - 27 ธ.ค.66 (ขยายสัญญา 2 ม.ค.67 - 29 มิ.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ๗.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
3	4100065405	ภ.7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด อาคารที่ทำการ ๗.7 (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	6,000,000.00	6,000,000.00	3 ส.ค.66 - 30 ม.ค.67 (ขยายสัญญา 2 ม.ค.67 - 29 มิ.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ๗.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
4	4100069622	ภ.7	ซ่อมแซมบ่อน้ำรักษาการณหรือส่วนประกอบโรงจอดรถยนต์บ้านพัก มทบ.๗.7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611220	498,500.00	498,500.00	21 ส.ค.66 - 21 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
5	4100069752	ภ.7	ซ่อมแซมห้องพักแฟลต ๗.7 (โพธิ์ทอง) ซับประทวน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611220	367,100.00	367,100.00	23 ส.ค.66 - 23 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
6	4100069825	ภ.7	ซ่อมแซมห้องพักแฟลต ๗.7 (หน้าโรงเรียนราชินีบูรณะ หลังที่ 1 ,หลังที่ 2) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611220	206,700.00	206,700.00	23 ส.ค.66 - 23 ต.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
7	4100071318	ภ.7	ปรับปรุงชั้นลาดฟ้าอาคารจอดรถ ๗.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611320	268,800.00	268,800.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66 (ขยายสัญญา 30 พ.ย.66 - 1 เม.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ๗.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
8	4100071323	ภ.7	ปรับปรุงบันไดที่อาคาร นท.๗.๗ (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	6611320	489,400.00	489,400.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66 (ขยายสัญญา 30 พ.ย.66 - 1 เม.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ๗.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งเงิน	มูลค่าพึงไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
9	4100071329	ภ.7	ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคาร ภ.7 (แห่งใหม่) ต. พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว. นครปฐม	6611320	330,700.00	330,700.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66 (ขยาย สัญญา 30 พ.ย.66 - 1 เม.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
10	4100071359	ภ.7	ปรับปรุงขนาดฝ้าอาคารจอดรถ ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	6611320	250,600.00	250,600.00	23 ส.ค.66 - 29 พ.ย.66 (ขยาย สัญญา 30 พ.ย.66 - 1 เม.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
11	4100071383	ภ.7	ปรับปรุงห้องทำงานอาคาร ภ.7 (แห่งใหม่) และ ปรับปรุงห้องทำงานอาคาร บก.ภ.ภ.7 (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	6611310	497,000.00	497,000.00	23 ส.ค.66 - 30 ต.ค.66 (ขยาย สัญญาครั้งที่หนึ่ง 31 ต.ค.66 - 2 มี.ค.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
12	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	6611310	60,000.00	60,000.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยาย สัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงวดที่ 1
13	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	6611310	90,000.00	90,000.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยาย สัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงวดที่ 1
14	4100078657	ภ.7	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 23 เครื่อง	6611310	46,805.00	46,805.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยาย สัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงวดที่ 1
15	4100058185	ภ.จว.ราชบุรี	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 16,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง	6611310	180,000.00	180,000.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยาย สัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงวดที่ 1
16	4100078657	ภ.7	จ้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น ๑ อาคาร บก. อ.ภ.๗ (แห่งใหม่) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม จว.นครปฐม	6611320	1,871,195.00	1,871,195.00	20 ก.ย.66 - 18 ม.ค.67 (ขยาย สัญญา 19 ม.ค.67 - 1 พ.ค.67)	จำนวน 3 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เมื่อ ภ.7 (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงวดที่ 1
17	4100058185	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก. (แบบแปลน) หลังที่ 1	6611320	2,977,000.00	2,977,000.00	17 ธ.ค.65 - 9 พ.ย.66	จำนวน 5 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	ระหว่างดำเนินการงวด 3 - 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 4 และ 5
18	4100058188	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก. (แบบแปลน) หลังที่ 2	6611320	2,977,000.00	2,977,000.00	17 ธ.ค.65 - 9 พ.ย.66	จำนวน 5 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	ระหว่างดำเนินการงวด 3 - 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 4 และ 5
19	4100065517	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.ราชบุรี	6611320	13,500,000.00	13,500,000.00	31 ก.ค. 66 - 25 มี.ย.67	จำนวน 8 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ระหว่างดำเนินการงวด 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 1

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
16	4100064363	ภ.จว.กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	6611320	13,528,000.00	12,175,200.00	20 ก.ค.66 - 14 มิ.ย.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	ระหว่างดำเนินการงวด 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3
17	4100065070	ภ.จว.สุพรรณบุรี	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี	6611320	12,640,000.00	8,848,000.00	26 ก.ค.66 - 19 มิ.ย.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4
18	4100051800	ภ.จว.สมุทรสาคร	ก่อสร้างอาคารแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ได้ อนุมัติ)	6611320	25,755,000.00	3,209,956.25	2 ธ.ค.65-27 พ.ย.66 (ขยายสัญญา 28 พ.ย. - 17 ธ.ค.66)	จำนวน 11 งวด เบิกจ่ายแล้ว 10 งวด	อยู่ระหว่างทำการตรวจรับงวด 8	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 11
19	4100070737	ภ.จว.สมุทรสาคร	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (ขนาดเล็ก)	6611320	14,200,000.00	14,200,000.00	25 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 67	จำนวน 8 งวด ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นงวด 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1
20	4100065135	ภ.จว. สมุทรสงคราม	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.สมุทรสงคราม	6611320	13,100,000.00	7,860,000.00	27ก.ค.66 - 21 มิ.ย.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4
21	4100071060	ภ.จว. ประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,989,000.00	9,849,643.20	29 ส.ค. 66 - 24 ก.ค.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4
			รวม ภ.7 จำนวน 21 รายการ		132,912,800.00	93,214,899.45				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินประมาณปี พ.ศ.2566 ไปเบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100036181	ภ.8	เช่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 120/30 Mbps (ระบบสำรอง) จำนวน 1 ระบบ	6611240	232,404.00	19,367.00	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)		ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว	เสร็จสิ้นสัญญา เนื่องจากผู้ให้เช่าเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร	
2	4100079158	ภ.8	จ้างซ่อมแซมตู้และระบบไฟฟ้าทางเข้าตัวอาคารภาค 8 จำนวน 1 งาน	6611220	448,000.00	448,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม	
3	4100082618	ภ.8	จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 1 หลัง	6611220	492,000.00	492,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม	
4	4100082678	ภ.8	จ้างปรับปรุงผนังทางเดินภายในอาคารที่ทำการ บก.ส.ส.ภ.8	6611320	487,000.00	487,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม	
5	5100003931	ภ.8	เช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 23 เครื่อง	6611220	150,000.00	7,156.20			ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว	เงินเหลือจากการเบิกจ่าย สลาย PO แล้ว	
6	4100060873	ภ.จว. นครศรีธรรมราช	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.บางขัน จว.นศ.	6611320	21,117,740.03	15,021,860.00	8 ก.พ.66 ถึง 2 ก.พ.67	10 งวดงาน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-4 รวมเป็นเงิน 6,095,880.03 บาท	อยู่ระหว่างก่อสร้าง กวดที่ 4/10 (ประมาณ 50%)	- ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 5 (ดำเนินการไปแล้วประมาณ 85%) - งานล่าช้ากว่าแผนงาน ประมาณ 90 วัน -ภ.จว. นครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และแจ้งส่งงานสิทธิ์คำปรับตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.66	
7	4100062168	ภ.จว.กระบี่	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.ลำทับ ขนาดกลาง	6611320	20,480,000.00	13,402,972.00	1 มี.ค.66-3เม.ย.67		กำหนดส่งงวดงานที่ 5-6 ประมาณ กลางเดือนพ.ย.		
8	4100066737	ภ.จว.กระบี่	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.กระบี่ ขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ	6611320	14,245,000.00	13,081,518.50	9 ส.ค.66-3มิ.ย.67		กำหนดส่งงวดงานที่ 2 วันที่ 9 พ.ย. 66		
9	4100082108	ภ.จว.กระบี่	ซ่อมแซมห้องมีอาคารที่ทำการ ภ.จว.กระบี่	6611220	360,000.00	360,000.00	26 ก.ย.-27 พ.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม		
10	4100075748	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรกลาง อาคาร 1	6611220	281,140.00	281,140.00	1 สิงหาคม 2566 - 29 ตุลาคม 2566	เบิกงวดงานเดียว งวดงานละ 281,140.- บาท (มีค่าปรับ 5,100 บาท) จะ เบิกจ่าย 276,040.- บาท	อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารเพื่อ ครองรับงานและส่งมอบให้ตาม สัญญาจ้างต่อไป		

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
11	4100075751	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรกลาง อาคาร 2	66111220	296,700.00	296,700.00	2 สิงหาคม 2566 - 29 ตุลาคม 2566	เบิกงวดงานเดียว งวดงานละ 296,700.- บาท (มีค่าปรับ 5,100 บาท) จะเบิกจ่าย 291,600.- บาท	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารเพื่อ ตรวจรับงานและส่งส่งเบิกจ่ายตาม สัญญาจ้างต่อไป
12	4100080655	ภ.จว.ภูเก็ต	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.เมืองภูเก็ต	66111220	498,000.00	498,000.00	26 กันยายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566	เบิกงวดงานเดียว 498,000.- บาท ค่าปรับ 13,944.- บาท คงเหลือ 484,056.- บาท		
13	4100080657	ภ.จว.ภูเก็ต	ก่อสร้างโรงจอดรถของกลาง สภ.เมืองภูเก็ต	66111320	499,800.00	499,800.00	26 กันยายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566	เบิกงวดงานเดียว 499,800.- บาท		
14	4100063068	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	66111320	17,880,000.00	12,516,000.00	13 ก.ค.2566 ถึง 7 มี.ย.2567		งวดงานที่ 1 รอคกรวจรับ (กำลัง ดำเนินการงวด 2)	อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง
15	4100082201	ภ.จว.ระนอง	ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ภ.จว.ระนอง	66111320	14,868,000.00	13,381,200.00	28 ก.ย.2566 ถึง 22 ต.ค.2567	เบิกงวดที่ 1 แล้วเสร็จ	รอคกรวจรับ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรอกสร้างงาน งวดที่ 2 คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2 ได้ ภายในเดือน ม.ค. 67
16	4100045294	ภ.จว.ชุมพร	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ท่าชนะ	66111320	20,770,000.00	7,684,900.00	8 มี.ค.66 ถึง 10 เม.ย.67			
17	4100065398	ภ.จว.ชุมพร	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 191 ภ.จว.ชุมพร	66111320	15,880,000.00	14,609,600.00	28 ก.ค.66 ถึง 14 ก.ย. 67			
			รวม ภ.8 จำนวน 17 รายการ		128,985,784.03	99,087,213.70				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ใ้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึง การขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบัน/เบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100060074	ภ.จ.สงขลา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดกลาง) สก.ควนเมียง 1 หลัง	6611320	21,949,000.00	8,609,887.00	เริ่ม 28 ก.ย.66 สิ้นสุด 23 มี.ค.67	มี 10 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 7 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8/10
2	4100067995	ภ.จ.สงขลา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดกลาง)สก.นาหม่อม จำนวน 1 หลัง	6611320	22,039,000.00	8,481,236.00	เริ่ม 28 ก.ย.66 สิ้นสุด 23 มี.ค.67	มี 10 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 7 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8/10
3	4100064386	ภ.จ.สตูล	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุ อุทกภัย 191 ภ.จ.สตูล	6611320	14,400,000.00	11,520,000.00	เริ่ม 21 ก.ค.66 สิ้นสุด 12 ก.ย.67	มี 8 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3/8
4	4100066665	ภ.จ.ตรัง	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุ อุทกภัย 191 ของ ภ.จ.ว.ตรัง	6611320	12,345,000.00	9,876,000.00	เริ่ม 4 ส.ค.66 สิ้นสุด 26 ก.ย.67	มี 8 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน งวดงานที่ 3 ส่งมอบวันที่ 25 ม.ค.67	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 และ ตรวจรับงานงวดที่ 1 ในวันที่ 7 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4/8
5	4100072517	ภ.จ.ตรัง	ซ่อมแซมห้องน้ำ สก.เมืองตรัง	6611220	439,000.00	439,000.00	เริ่ม 4 ก.ย.66 สิ้นสุด 28 ก.พ.67	จำนวน 1 งวดงาน	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างซ่อมแซม (คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในกำหนด)
6	4100072815	ภ.จ.ตรัง	จ้างติดตั้งเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการ ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	67,200.00	67,200.00	เริ่ม 5 ก.ย.66 สิ้นสุด 16 ม.ค.67	อยู่ระหว่างรอตั้งเบิก	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน 26 ม.ค.67
7	4100078456	ภ.จ.ตรัง	จ้างติดตั้งเครื่องแบบสนาม สำหรับข้าราชการ ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่งานจราจร	6611220	4,200.00	4,200.00	เริ่ม 16 ก.ย.66 สิ้นสุด 14 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างรอตั้งเบิก	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ธ.ค.66	คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน 26 ม.ค.67
8	4100066654	ภ.จ.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุอุทกภัย 191 ภ.จ.ว.พัทลุง	6611320	12,940,000.00	10,352,000.00	เริ่ม 5 ส.ค.66 สิ้นสุด 29 มิ.ย.67	มี 8 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ 1-2	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3
9	4100068258	ภ.จ.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) สก.เมืองพัทลุง	6611320	34,251,704.00	22,079,360.00	เริ่ม 7 เม.ย.66 สิ้นสุด 30 เม.ย.67	มี 13 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่าย 1-5	อยู่ระหว่างงบการเงินเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6, 7, 8, 9
10	4100047423	ภ.จ.ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ได้งบสง) พร้อมส่วนประกอบต่าง สก.สายบุรี จำนวน 1 หลัง	6611320	29,118,000.00	22,974,102.00	18 มี.ค.66 ถึง 9 ก.ค.67	มี 20 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่าย 1-5 งวด	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด/ปัจจุบัน ดำเนินการงวดที่ 4	เมื่อ 23 ม.ค.67 ผู้รับจ้างได้ส่งงาน จำนวน 2 งวด คือ งวดที่ 6 และ งวดที่ 8 นัดตรวจใน 26 ม.ค.67 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 7 และ งวดที่ 9

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึง การขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
11	4100068038	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน(ขนาดเล็ก) ศูนย์ 191 ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 1 หลัง	6611320	15,480,000.00	13,932,000.00	4 ส.ค.66 ถึง 28 มิ.ย.67	มี 8 งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่าย 1 งวด	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง นัดตรวจงาน และจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 ม.ค.67	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง นัดตรวจงาน และจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 ม.ค.67	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง นัดตรวจงาน และจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 ม.ค.67
12	4100081034	ภ.จว.ปัตตานี	โครงการซ่อมแซมบ้านพักมอญ ภ.จว.ปัตตานี	6611220	100,000.00	100,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 27 พ.ย.66	มี 1 งวดงาน ไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
13	4100081046	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างห้องสุตรวจการณระยะไกล ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 6 จุด	6611320	1,320,000.00	1,320,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 26 ม.ค.67	มี 1 งวดงาน ไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง นัดตรวจงาน และจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 ม.ค.67
14	4100081049	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างห้องสุตรวจการณระยะไกล มว. ลก.ม.ปท.ปัตตานี จำนวน 10 จุด	6611320	2,200,000.00	2,200,000.00	29 ก.ย.66 ถึง 26 ม.ค.67	มี 2 งวดงาน ไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง นัดตรวจงาน และจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 ม.ค.67
15	4100079649	ภ.จว.ยะลา	ก่อสร้างห้องสุตรวจการณระยะไกล ภ.จว.ภ.จว.ยะลา จำนวน 4 จุด	6611320	880,000.00	880,000.00	เริ่มต้น 23 ก.ย.66 สิ้นสุด วันที่ 20 ม.ค.67	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจรับ	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
16	4100047857	ภ.จว.นราธิวาส	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.เมืองนราธิวาส	6611320	41,075,000.00	33,681,500.00	เริ่มสัญญา 28 มิ.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย.67	งวดงานทั้งหมด 30 งวด ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 6 ระหว่างตรวจรับ 1 งวด(งวดที่7)	งวดงานทั้งหมด 30 งวด ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 6 ระหว่างตรวจรับ 1 งวด(งวดที่7)	งวดงานทั้งหมด 30 งวด (งวดที่ 1-5) ปัจจุบันระหว่างก่อสร้างงวดที่ 6	เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 ได้ส่งงวดงานเพิ่มเติม (งวดที่ 7) ระหว่างตรวจรับ และวางเปิดต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8
17	4100059585	ภ.จว.นราธิวาส	อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	17,350,000.00	12,231,750.00	เริ่มสัญญา 22 มิ.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ค.67	งวดงานทั้งหมด 19 งวด ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 6	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด (งวดที่ 1-3) ปัจจุบันระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4	ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด (งวดที่ 1-3) ปัจจุบันระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
18	4100053403	ศษ.ร.ศษ.	จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานฝึกอบรม (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาด 100 เมตร x 0.15 เมตร x 180 เมตร ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,800 ตารางเมตร ของ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 โดยวิธีจัดเลือก	6611230	17,800,000.00	8,989,000.00	สัญญาจ้างเลขที่ 4/2566 ลง 20 เม.ย. 66 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลง 13 พ.ย.66 เพิ่มระยะเวลาดำเนินการจำนวน ไม่เกินร้อยละ 50 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ม.ค.68 สัญญาเริ่มต้นเมื่อวันที่ 21 เม.ย.66 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 ก.พ.67 ระยะเวลา 300 วัน	งวดงานทั้งหมด 16 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 7	สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 20 เม.ย.66 ระยะเวลา 210 วัน เบิกจ่ายไปแล้ว 4 งวด เป็นเงิน 4,539,000 บาท คงเหลือ 12 งวด เป็นเงิน 13,261,000 บาท คณะกรรมการได้ทำหนังสือแจ้งรัดการดำเนินการ ไป 2 ครั้งแล้ว	เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 ได้ส่งมอบงวดงานที่ 8 - 9 เพื่อตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 10 - 15 ต่อไป
19	4100053842	ศปก.ตร.สน.	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัวได้ทุนโล่ง ศษ.ร.ภ.9	6611230	30,490,000.00	30,490,000.00	ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 9 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ย.67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
20	4100070746	ศปก.ตร.สน.	ค่าก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ของ ศษ.ร.ภ.9	6611230	25,500,000.00	25,500,000.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 ส.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 23 ส.ค.67	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 1 และงวดที่ 12	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 1 และ 12
21	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการบังคับใช้กฎหมาย	6611230	137,725.00	137,725.00	เริ่มต้นสัญญา วันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งของ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งของ
	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการรักษาความปลอดภัย	6611230	91,000.00	91,000.00	เริ่มต้นสัญญา วันที่ 20 ก.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งของ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งของ
	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการเพิ่ม	6611230	2,101,400.00	2,101,400.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.67	อยู่ระหว่างส่งของ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งของ
	4100079342	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนเล็กแบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร (M193) โครงการปฏิรูป	6611230	682,500.00	682,500.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.67	อยู่ระหว่างส่งของ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งของ
22	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตร โครงการบังคับใช้	6611230	74,726.40	74,726.40	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.67	อยู่ระหว่างส่งของ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งของ
	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตร โครงการรักษาความปลอดภัย	6611230	78,000.00	78,000.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย.67	อยู่ระหว่างส่งของ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งของ
	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตร โครงการเพิ่ม	6611230	1,815,444.60	1,815,444.60	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งของ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งของ
	4100079350	ศปก.ตร.สน.	กระสุนปืนพกแบบ 87 ขนาด 9 มิลลิเมตร โครงการปฏิรูป	6611230	504,069.00	504,069.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 ก.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างส่งของ	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งของ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค. 67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค. 67)
23	4100082379	ศปก.ตร.สน.	ค่ากระสุนปืนลูกของ ขนาดเบอร์ 12 (12 GAUGE) กิจกรรมโครงการบังคับใช้	6611230	7,700.00	7,700.00	เริ่มต้นสัญญา 29 ก.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในวันที่ 2 ก.พ. 67	รอส่งมอบที่สุด	อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในวันที่ 2 ก.พ. 67
	4100082379	ศปก.ตร.สน.	ค่ากระสุนปืนลูกของ ขนาดเบอร์ 12 (12 GAUGE) กิจกรรมโครงการเพิ่มฯ	6611230	137,550.00	137,550.00	เริ่มต้นสัญญา 29 ก.ย. 66 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในวันที่ 2 ก.พ. 67	รอส่งมอบที่สุด	อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในวันที่ 2 ก.พ. 67
			รวม ก.9 จำนวน 23 รายการ		305,378,219.00	229,357,350.00				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่เข้าไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมดปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
1	4100034693	บช.ทพ.	เช่าเครื่องถ่าย ส.ทพ.2 กก.3 บก.ทพ.3	6611220	28,800.00	24,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	12 งวดงาน เบิกงวดที่ 1 - 2 แล้ว	เบิกจ่ายครบแล้ว	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
2	4100036710	บช.ทพ.	เช่ารถ 138 คัน	6611220	15,965,400.00	5,764,200.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.68	เบิกถึงงวดที่ 37	งวดงานที่ 35 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
3	4100056862	บช.ทพ.	ซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ทพ.2 กก.2 บก.ทพ.2	6611230	30,000.00	30,000.00	28 มี.ค.-2เม.ย.66	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
4	4100057809	บช.ทพ.	เช่ารถสายตรวจ 20 คัน	6611220	3,844,440.00	427,160.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 เม.ย.66-31 มี.ค.71	เบิกถึงงวดที่ 9	อยู่ระหว่างขอใบแจ้งหนี้ งวดงานที่ 7	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
5	4100061567	บช.ทพ.	ซื้อชาติและเปลี่ยนสติ๊กเกอร์	6611230	39,761.20	39,761.20	15 วันทำการ	รอการตรวจรับ	ส่งเบิก 3 ก.ค.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
6	4100071478	บช.ทพ.	เช่ารถสายตรวจ 16 คัน	6611220	1,776,480.00	599,200.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 มี.ค.66-29 ก.พ.71	เบิกถึงงวดที่ 11	ส่งเบิกเดือน ก.ย. ณ วันที่ 5 ต.ค.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
7	4100071517	บช.ทพ.	เช่ารถสายตรวจ 20 คัน	6611220	1,414,460.00	1,414,460.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 มี.ค.66-31 มี.ค.71	เบิกถึงงวดที่ 9	ส่งเบิกเดือน ก.ย.66 ณ วันที่ 11 ต.ค.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
8	4100074172	บช.ทพ.	จ้างทำป้ายไวนิล สปก.	6611220	65,000.00	65,000.00	30 วันทำการ	รอการส่งเบิก	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
9	4100074326	บช.ทพ.	เช่ารถสายตรวจ 10 คัน	6611220	2,600,400.00	1,952,400.00	สัญญาเช่า 5 ปี 16 ก.ย.66-15 ก.ย.71	เบิกถึงงวดที่ 4	อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
10	4100074593	บช.ทพ.	เช่ารถ 138 คัน	6611220	15,965,400.00	15,965,400.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.68	ยังไม่มีการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประจำเดือน มี.ค. - ก.ย.67	จะเริ่มเบิกตั้งแต่ มี.ค.67 - ก.ย.67	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
11	4100079011	บช.ทพ.	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	6611310	29,660,000.00	29,660,000.00	21 ก.ย.66 - 17 พ.ค.67	อยู่ระหว่างเบิกงวดที่ 1	กำหนดวันที่ 17 พ.ค.67	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าพึงไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
12	4100082677	บช.ทท.	ซื้อรถบรรทุกที่เลขขนาด 1 คัน	6611310	3,380,000.00	3,380,000.00	22 ก.ย.66 - 21 พ.ย.66	รอการตรวจรับ	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	รอการตรวจรับ
			รวม บช.ทท. จำนวน 12 รายการ		74,770,141.20	59,321,581.20				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
1	4100075805	บ.ช.ก.	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา และสาธารณูปโภคอาคารศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611320	1,298,700.00	909,090.00	5 ก.ย.66-3 ม.ค.67	จำนวน 5 งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงวด 1 แล้วอยู่ระหว่างของอนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงวด 1	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67) เหลือ 3 งวดงาน ขยายเวลาส่งมอบ 30 วัน
2	4100080813	บ.ช.ก.	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์เครื่อหระและประมวลผลข้อมูลโดยเชื่อมโยง บ.ช.ก.	6611310	47,940,280.00	43,146,252.00	27 ก.ย.66 - 23 พ.ค.66	จำนวน 3 งวดงาน	รอการส่งมอบงาน งวดที่ 1	รอการส่งมอบงาน งวดที่ 1	-เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด จำนวนเงิน 4,794,028.- บาท
3	4100081234	บ.ช.ก.	จัดจ้างทำงตรศรสัญญาลักษณะประจำหน่วยงานในสังกัด บ.ช.ก.	6611220	168,000.00	168,000.00	26 ก.ย.66 - 25 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	ยังไม่ได้เบิกจ่าย/ขยายสัญญา
4	5100002458	บ.ช.ก.	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6611220	492,000.00	6,538.32	1 ต.ค.65-30ก ก.ย.66	จำนวน 12 งวดงาน	ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว	ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว	สลาย PO เรียบร้อยแล้ว
5	4100037329	บ.ก.ร.บ.	จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข 536 สังกัด ส.ร.น.4 ก.4 บ.ก.ร.บ.	6611310	14,470,000.00	3,617,500.00	22 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.66	จำนวน 4 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	คงเหลือ 2 งวด / แจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10	คงเหลือ 2 งวด / แจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) วันที่ 10 ก.พ.67
6	4100077907	บ.ก.ร.บ.	จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ บ.ก.ร.บ. (หลังเก่า) เพื่อใช้เป็นอาคารฝึกอบรมและอาคารที่ทำการ ก.ก.3 บ.ก.ร.บ.	6611320	8,289,888.00	8,289,888.00	19 ก.ย.66 - 15 พ.ค.67	จำนวน 9 งวด / ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญาจ้าง
7	4100083075	บ.ก.ร.บ.	จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ สป.น.ม.16, เรือตรวจการณ์ สป.น.ม.17 และเรือตรวจการณ์ สป.น.ม.18 สังกัด สป.น.ม.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611500	499,000.00	149,700.00	30 ก.ย.66 - 27 ม.ค.67	จำนวน 3 งวด / เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างการจัดทำ	อยู่ระหว่างการจัดทำ	ครบกำหนด 27 ม.ค.67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
8	5100002009	บ.ก.ร.บ.	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บ.ก.ร.บ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611220	496,800.00	0.36	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	จำนวน 12 งวด/เบิกจ่ายแล้ว 12 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	สลาย PO เรียบร้อยแล้ว
9	5100003807	บ.ก.ร.บ.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6611230	635,600.00	22.53	8 ก.ย.66 - 19 ม.ค.67	จำนวน 1 งวด /เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สลาย PO เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
10	5100004042	บก.จน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6611230	857,723.56	54,72	27 ก.ย.66 - 21 มี.ค.67	จำนวน 1 งวด /เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สลาย PO เรียบร้อยแล้ว
11	5100004079	บก.จน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6611230	999,982.62	63.80	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	จำนวน 1 งวด /เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สลาย PO เรียบร้อยแล้ว
12	5100004080	บก.จน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6611230	6,645,972.82	6,645,972.82	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	จำนวน 1 งวด /ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ครบกำหนด 26 มิ.ย.67
13	5100004081	บก.จน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6611230	2,354,000.00	2,354,000.00	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	จำนวน 1 งวด /ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ครบกำหนด 26 มิ.ย.67
14	5100004082	บก.จน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6611500	447,742.30	7.67	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	จำนวน 1 งวด /เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สลาย PO เรียบร้อยแล้ว
15	5100004087	บก.จน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6611230	758,853.95	25.59	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	จำนวน 1 งวด /เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สลาย PO เรียบร้อยแล้ว
16	5100004088	บก.จน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6611230	941,600.00	38.52	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	จำนวน 1 งวด /เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สลาย PO เรียบร้อยแล้ว
17	5100004089	บก.จน.	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6611230	3,058,674.02	10.15	2 ต.ค.66 - 26 มิ.ย.67	จำนวน 1 งวด /เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สลาย PO เรียบร้อยแล้ว
18	4100078914	บก.ป.	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ อาคารบี	6611320	360,000.00	360,000.00	19 ก.ย.66-18 พ.ย.66	จำนวน 1 งวดงาน สิ้นมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	รอส่งมอบ	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
19	4100081258	บก.ป.	โครงการปรับปรุงทางขึ้นลงและบริเวณที่เกี่ยวข้องกับสนามยิงปืนกองบังคับการปราบปราม	6611320	499,900.00	499,900.00	27 ก.ย.66-24 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน อยู่ระหว่างส่งมอบ	รอส่งมอบ	ครบกำหนด 24 ม.ค.67 อยู่ระหว่างเร่งรัดส่งมอบ
20	4100043104	มท.904	จัดซื้อรถปฏิบัติการขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบบังคับโจ๊ม จำนวน 2 คัน	6611310	33,980,000.00	33,980,000.00	15 ก.พ. - 12 ธ.ค.66	จำนวน 1 งวดงาน อยู่ระหว่างส่งมอบ	รอส่งมอบงานตามสัญญา	ขยายเวลาส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 11 มี.ค.67
21	4100077249	มท.904	จัดซื้อกระสุนปืนพก แบบ 87 ขนาด 9 มม. จำนวน 200,000 นัด	6611230	3,970,000.00	3,970,000.00	15 ก.ย. - 13 ม.ค.67	จำนวน 1 งวดงาน สิ้นมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	รอส่งมอบงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
			รวม บข.ก. จำนวน 21 รายการ		129,164,717.27	104,097,064.48				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เป็นเดือนมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100075516	บก.สอท.2 บข.สอท.	งานไม้กันรถยนต์พร้อมระบบกล้อง อานป่าฯ ทะเบียนรถ Car Park เข้า-ออก อาคาร อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	497,550.00	497,550.00	1 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	1 งวด/ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำ เอกสารเบิกจ่าย	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	4100075529	บก.สอท.2 บข.สอท.	ระบบรักษาความปลอดภัย access control เข้า - ออก อาคาร 6 ชั้น อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	497,764.00	497,764.00	13 ก.ย.66 - 11 พ.ย.66	1 งวด/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสัญญา กำหนดส่ง มอบ 11 พ.ย.66	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
3	4100075530	บก.สอท.2 บข.สอท.	ระบบกล้องวงจรปิด CCTV อาคาร 6 ชั้น อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี	6611310	498,620.00	498,620.00	1 ก.ย.66 - 30 ก.ย.66	1 งวด/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ/จัดทำ เอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
4	4100079638	บก.สอท.2 บข.สอท.	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงาน กก.วิเคราะห์ข้าวและเครื่องมือพิเศษฯ	6611310	495,000.00	495,000.00	22 ก.ย.66 - 20 พ.ย.66	1 งวด/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสัญญา กำหนดส่ง มอบ 20 พ.ย.66	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
5	4100068242	บก.สอท.3 บข.สอท.	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 ตำบลลำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6611320	26,268,800.00	16,436,300.00	450 วัน (25 ก.ค.66-16 ต.ค.67)	43 งวดงาน (เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ยังไม่ส่งมอบงาน	- เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เมื่อ 4 ม.ค.67 จำนวนเงิน 9,832,500 บาท ขณะนี้บริษัทส่งมอบงาน/ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อีกจำนวน 3 งวด จำนวนเงิน 8,914,800 บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวดต่อไป ประมาณ เดือน ก.พ.67

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่นำไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
6	4100070317	บก.สอท.4 บข.สอท.	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	6611320	26,085,000.00	20,872,240.00	450 วัน (26 ส.ค.66-17 พ.ย.67)	43 งวดงาน (เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ยังไม่ส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
7	4100065300	บก.สอท.5 บข.สอท.	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	6611320	25,734,000.00	25,734,000.00	450 วัน (12 ก.ค.66-3 ค.ค.67)	43 งวดงาน (เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ยังไม่ส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
8	4100054561	บก.คตพ.บข.สอท.	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานดิจิทัล บก.คตพ.	6611310	47,450,000.00	28,470,000.00	360 วัน (16พ.ค.66-10 พ.ค.67)	4 งวดงาน (เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ส่งมอบงานงวดที่ 3)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

62

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดจนถึงงวดปัจจุบัน/ปัจจุบันเป็นงวดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
9	4100066457	บก.ศอท.บข.สอท.	โครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์	6611310	6,620,554.80	3,115,555.20	240 วัน (7ส.ค.66- 3ม.ย.67)	3 งวดงาน (เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3	- กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ประมาณเดือน มี.ค.67 จำนวนเงิน 3,115,555.20 บาท
			รวม บข.สอท. จำนวน 9 รายการ		134,147,288.80	96,617,029.20				

รายงานรายการ ไปรษณีย์ (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100082364	บก.อก.บช.ปศ.	จ้างที่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระบอกโวจีล	6611500	1,627,470.00	1,627,470.00	27 ก.ย.66 - 26 ม.ค.67		รอส่งของ	รอส่งของ
			รวม บช.ปศ. จำนวน 1 รายการ		1,627,470.00	1,627,470.00				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อข้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่แจ้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100030763	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	11,934,000.00	4,972,500.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	3 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอ ส่งเบิก	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3
2	4100030775	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	19,094,400.00	19,094,400.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	6 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอ ส่งเบิก	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6
3	4100043125	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	101,439,000.00	101,439,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	4 งวดงาน เบิกจ่าย -	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอ ส่งเบิก	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1
4	4100043126	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	3,978,000.00	3,978,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	3 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอ ส่งเบิก	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3
5	4100073038	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ ประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	6611320	5,001,741.00	5,001,741.00	22 มิ.ย.- 23 ธ.ค.66	2 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอ ส่งเบิก	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2
6	4100062303	บ.ก.อ.บข.ส.	ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจ สืบสวนข่าว	6611220	3,645,640.00	1,399,240.00	1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.67	4 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอ ส่งเบิก	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รอ ส่งเบิก ประจำเดือน ม.ค.67 (งวดที่ 3)
7	4100080738	บ.ก.อ.บข.ส.	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6611230	110,712.90	110,712.90	25 ก.ย.66 - 21 ธ.ค. 66	1 งวดงาน	อยู่ระหว่างรองส่งของ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
			รวม บข.ส จำนวน 7 รายการ		145,203,493.90	135,993,593.90				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อข้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเดือนมีนาคม กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไว้ใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะ วันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100039734	ต.จ.จ.มุกดาหาร	อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ต.ม.จ. นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม	6611320	16,827,500.00	10,769,600.00	29 ธ.ค.65 - 1 ก.พ.67	เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด งวดที่ 8 คกค.ตรวจรับงาน 18 ม.ค.67 อยู่ระหว่างดำเนินการเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 6,7, และอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 8 ผลดำเนินการอยู่ที่ 51.64% และงวดที่ 10 ผลการดำเนินการอยู่ที่ 53.44%	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
			รวม สด. จำนวน 1 รายการ		16,827,500.00	10,769,600.00			งวดที่ 9 ดำเนินการแล้ว 100% งวดที่ 10 ดำเนินการได้ 91.58%	

รายงานรายการ ในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือมี ครอบ กั้นยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าพึงใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100042014	บก.สสน.บข.ตชด.	เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตระบบการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMS Thai)	6611240	14,111.16	1,175.93	25 ต.ค.65-30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
2	4100058152	บก.สสน.บข.ตชด.	ซื้อรถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle) จำนวน 46 คัน	6611310	184,000,000.00	46,000,000.00	1 มิ.ย.66-16 พ.ค.69	11 งวดงาน /ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3	4100060789	บก.สสน.บข.ตชด.	ซื้อแบดเจอร์รถยนต์ทะเบียนใต้ 17180	6611230	2,850.00	2,850.00	12 มิ.ย.-27 มิ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	เป็นรายการที่ช่วยสร้าง PO ซ้ำซ้อน	เป็นรายการที่ช่วยสร้าง PO ซ้ำซ้อน
4	4100079045	บก.สสน.บข.ตชด.	จ้างซ่อมแซมอาคารแฟลต 1/11 บข.ตชด.	6611220	129,367.00	129,367.00	21 ก.ย.-20 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า อยู่ระหว่างแจ้งส่งงานสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
5	4100079072	บก.สสน.บข.ตชด.	จ้างซ่อมแซมแฟลต 1/12 บข.ตชด.	6611220	121,788.00	121,788.00	21 ก.ย.-20 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า อยู่ระหว่างแจ้งส่งงานสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
6	4100079075	บก.สสน.บข.ตชด.	จ้างซ่อมแซมแฟลต 1/14 บข.ตชด.	6611220	103,680.00	103,680.00	21 ก.ย.-20 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า อยู่ระหว่างแจ้งส่งงานสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
7	4100079533	บก.สสน.บข.ตชด.	ซ่อมแซมอาคารแฟลต 1 ซอยลือชา บข.ตชด.	6611220	279,605.00	279,605.00	22 ก.ย.-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า อยู่ระหว่างแจ้งส่งงานสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
8	4100079543	บก.สสน.บข.ตชด.	จ้างซ่อมแซมแฟลต 1 บางเขน	6611220	308,037.00	308,037.00	15 ก.ย.-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า อยู่ระหว่างแจ้งส่งงานสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
9	4100080554	บก.สสน.บข.ตชด.	จ้างซ่อมแซมระบบสุขภิบาล อาคารแฟลต 3 ซอยลือชา	6611220	465,200.00	465,200.00	15 ก.ย.-21 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า อยู่ระหว่างแจ้งส่งงานสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
10	5100001812	บก.สสน.บข.ตชด.	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 17 เครื่อง	6611220	730,000.00	292,837.70	20 ต.ค.65-30 ก.ย.66	12 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่ายจากการบรรลุวัตถุประสงค์	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่ายจากการบรรลุวัตถุประสงค์

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าพึงไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
11	4100039916	บก.ศษด.ภาค 1	อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น บก.ศษด.ภาค 1	6611320	26,250,000.00	8,925,000.00	19 ม.ค.66-23 เม.ย.67	11 งวดงาน /เบิกจ่ายถึงงวดที่ 8	เบิกจ่ายงวดที่ 7 เมื่อ 1 พ.ย.66 งานก่อสร้างได้ 60 %	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 9-11
12	4100042568	กก.ศษด.11	จ้างก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ได้ อนุมัติ) กก.ศษด.11 ต.มะขาม อ.มะขาม จ. จันทบุรี	6611320	22,178,000.00	13,909,901.60	10 ก.พ.66-4 พ.ค.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการของ คณะกรรมการและโยธาลงจังหวัด คำนวนงานลด-งานเพิ่ม จากงาน เสริม	อยู่ระหว่างดำเนินการของ คณะกรรมการและโยธาลงจังหวัด คำนวนงานลด-งานเพิ่ม จากงาน เสริม	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-11 (เลขที่ PO ใหม่ 4100090802)
13	4100070763	กก.ศษด.11	จ้างปรับปรุงอาคารคลังเก็บอาวุธ กก.ศษด.11 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี	6611320	499,100.00	499,100.00	28 ส.ค.-27 ต.ค.66	2 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1-2 อยู่ ระหว่างคณะกรรมการการตรวจรับ สั่งให้ให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานก่อสร้าง งวดงานที่ 2 (งานหนึ่งไม่เรียบร้อย)
14	5100003971	กก.ศษด.13	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611500	85,762.23	7.26	19 ก.ย.-27 ก.ย.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อย	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่าย จากการบริหารจัดอุปสงค์	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่าย จากการบริหารจัดอุปสงค์	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่าย จากการบริหารจัดอุปสงค์
15	5100004002	กก.ศษด.13	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611500	74,789.21	3.98	25 ก.ย.-30 ก.ย.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อย	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่าย จากการบริหารจัดอุปสงค์	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่าย จากการบริหารจัดอุปสงค์	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่าย จากการบริหารจัดอุปสงค์
16	5100004086	กก.ศษด.13	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	6611230	299,993.21	9.30	29 ก.ย.- 6 ต.ค.66	1 งวดงาน/เบิกจ่ายเรียบร้อย	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่าย จากการบริหารจัดอุปสงค์	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่าย จากการบริหารจัดอุปสงค์	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็น PO วงเงินไม่แน่นอน เป็นเงินเหลือจ่าย จากการบริหารจัดอุปสงค์
17	4100045641	บก.ศษด.ภาค 2	โครงการก่อสร้างรั้วโปร่ง บก.ศษด.ภาค 2 พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน	6611320	7,789,000.00	4,361,840.00	3 มี.ค.66-2พ.ย.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 และอยู่ระหว่าง ส่งเบิกงวดงานที่ 2,3,4	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ 5 (เลขที่ PO ใหม่ 4100083759 มูลค่าคงเหลือ 4,361,840 บาท)	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ 5 (เลขที่ PO ใหม่ 4100083759 มูลค่าคงเหลือ 4,361,840 บาท)
18	4100076287	บก.ศษด.ภาค 2	จ้างเหมาประกอบพิธีเปิดการศึกษาธิการศึกษาที่นักเรียนเก่า	6611500	35,500.00	35,500.00	1 ต.ค.66-29 ก.พ.67	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน ก.พ.67	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน ก.พ.67	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
19	4100082186	บก.ตชด.ภาค 2	จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำ คสน.บ.ก.ตชด.ภาค 2	6611500	328,320.00	196,560.00	1 ต.ค.66-29 ก.พ.67	5 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ 3 (เลขที่ PO ใหม่ 4100084868 มูลค่าคงเหลือ 196,560 บาท)
20	4100070528	บก.ตชด.ภาค 3	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ ระยะที่ 1	6611320	499,000.00	499,000.00	26 ส.ค.66 - 21 ก.พ.67	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
21	4100070529	บก.ตชด.ภาค 3	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ ระยะที่ 2	6611320	498,000.00	498,000.00	26 ส.ค.66 - 22 มี.ค.67	1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
22	4100040068	กก.ตชด.34	ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) ของ ศร.ตชด. พระยาประชาอากาศอารยา (1 หลัง)	6611320	1,090,000.00	1,090,000.00	21 ม.ค.66-15 มี.ค.67	4 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย	ปัจจุบันยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากเส้นทางกั้นการเข้าพื้นที่ถูกตัดขาดจากการเกิดฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
23	4100044336	กก.ตชด.34	ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านแม่เงินทะ (1 หลัง)	6611320	1,099,000.00	879,200.00	28 ก.พ.-24 ธ.ค.66	4 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1	ปัจจุบันยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากเส้นทางกั้นการเข้าพื้นที่ถูกตัดขาดจากการเกิดฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
24	4100040577	บก.ตชด.ภาค 4	เรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา	6611320	7,900,000.00	6,715,000.00	27 ม.ค.-22 พ.ย.66	9 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3-4	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3-4
25	4100039556	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.426	6611320	1,260,000.00	1,260,000.00	19 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7
26	4100039558	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.426	6611320	1,260,000.00	1,260,000.00	20 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7
27	4100039559	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.426	6611320	1,680,000.00	1,680,000.00	21 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7
28	4100050203	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว	6611320	2,666,000.00	2,666,000.00	23 ม.ค.66-13 มี.ค.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 9	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 11	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 11
29	4100041420	กก.ตชด.43	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโรง) กก.ตชด.43 ตำบลบาง อ.เมือง จ.สงขลา	6611320	24,364,999.00	12,182,499.50	31 ม.ค.66-24 พ.ค.67	11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7-8

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
30	4100047684	บก.สอ.บช.ตชด.	ก่อสร้างอาคารศูนย์อำนวยความสะดวกควบคุมสั่งการสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษนครสวรรค์ 261	6611320	42,980,000.00	27,937,000.00	24 มี.ค.66-17 ก.พ.67	8 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 3	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
31	4100054229	บก.สอ.บช.ตชด.	ก่อสร้างเรือนแถวขึ้นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 หลัง	6611320	29,137,490.00	8,569,850.00	19 ม.ค.66-13 ก.พ.67	8 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 7	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8
32	4100077379	บก.สอ.บช.ตชด.	ซ่อมแซมยานพาหนะ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.	6611220	5,000,000.00	1,500,000.00	18 ก.ย.66-16 ม.ค.67	2 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 2
33	4100077403	บก.สอ.บช.ตชด.	คำบำรุงรักษาอุโมงค์ลมขี้นเงินตา	6611500	2,500,300.00	1,009,795.62	18 ก.ย.66-12 ก.ย.67	4 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 2
			รวม บช.ตชด. จำนวน 33 รายการ		365,629,891.81	143,378,807.89				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะ วันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100040719	ศพฐ.2	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง งวดที่ 17	6611320	25,350,000.00	11,927,240.62	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	25 งวดงาน/ งวดงานที่เบิกทั้งสิ้น 23 งวดงาน ได้แก่วงวดงานที่ 1-17 , 19-24 คงเหลือ 2 งวดงาน ได้แก่งวดงานที่ 18 และ 25	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน รอเบิกจ่าย	งวดงานที่ 18 ดำเนินการเรื่อง ทดสอบระบบพร้อมแปลงและรอส่งมอบงวดงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,950,000 บาท, งวดงานที่ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจ้างเพิ่ม-ลดกรณีลดงานเสาอากาศวิทยุ จำนวนเงินทั้งสิ้น 9,977,240.62 บาท
			รวม ศพฐ.ศร. จำนวน 1 รายการ		25,350,000.00	11,927,240.62				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ใช้งบประมาณปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100055751	ศทก.	โครงการพัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าทางคดีฯ ระยะที่ 2 งวดที่ 2-4	6611310	11,878,000.00	10,690,200.00	3 พ.ค.66 / 26 ก.พ.67	4 งวดงาน/ปัจจุบันเปิดถึงงวดที่ 1	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการรายงานผล	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 2
2	4100074227	ศทก.	โครงการระบบประจําเว็บไซต์โทรอนิกส์ฯ ระยะที่ 2 งวด 1-7	6611310	95,250,000.00	85,725,000.00	8 ก.ย.66 / 3 ก.ค.67	5 งวดงาน/ปัจจุบันเปิดถึงงวดที่ 1	อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลครบกำหนดเมื่อวันที่ 7 ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 2
3	4100081708	ศทก.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ศทก.ชั้น 2	6611320	497,500.00	497,500.00	28 ก.ย.66 / 12 ต.ค.66	1 งวดงาน/ปัจจุบันเปิดถึงงวดที่ 1	อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผล	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
4	4100082952	ศทก.	โครงการจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลท้องถิ่น	6611310	480,000.00	480,000.00	28 ก.ย.65 / 27 ธ.ค.66	1 งวดงาน/ปัจจุบันกำลังเบิกงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผล	อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อส่งเบิก
5	4100061468	บ.สสท.	โครงการปฏิรูประบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ระยะที่ 2 งวดที่ 2-3	6611310	41,500,000.00	12,450,000.00	4 ก.ค.66 / 30 ธ.ค.66	3 งวดงาน/ปัจจุบันเปิดถึงงวดที่ 2	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3
6	4100068875	บ.ก.สท.	โครงการจัดการระบบค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสืบสวนทางไซเบอร์ ตร.	6611310	244,150,000.00	244,150,000.00	18 ส.ค.66 / 13 พ.ค.67	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สามารถส่งมอบได้ภายในกำหนด
7	4100045884	สส.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขยายโครงข่ายระบบติดต่อสื่อสารและภารกิจต่างๆ งวดที่ 1-2	6611310	49,499,000.00	29,699,400.00	9 มี.ค.66 / 3 ม.ค.67	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 (ทั้งหมด 2 งวด)	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2
8	4100065483	สส.	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่การฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 นครศรีธรรมราช	6611320	500,000.00	500,000.00	10 ส.ค.66 / 7ธ.ค.66	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนรายการทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เข้าโहर (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
9	4100081170	สส.	ชื่ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตั้งใช้งาน ณ อาคารที่ทำการใหม่	6611310	498,887.50	498,887.50	26 ก.ย.66/25 พ.ย.66	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	
10	4100081198	สส.	ชื่อระบบเครือข่าย Network และ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ภายในอาคารที่ทำการใหม่	6611310	499,155.00	499,155.00	26 ก.ย.66/25 พ.ย.66	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	
11	4100081645	สส.	จ่ายค่าบริการระบบวิทยุดิจิทัล PS-LTE (BKK0002P)	6611220	994,565.00	994,565.00	27 ก.ย.66/26 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	
12	4100081650	สส.	ชื่ออุปกรณ์ซ่อมเสาอากาศชนิดโครงสร้างตามเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 22 รายการ	6611230	2,637,657.00	2,637,657.00	27 ก.ย.66/24 ก.พ.67	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	
			รวม สหส. จำนวน 12 รายการ		448,384,764.50	388,822,364.50				

รายงานรายการ ในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่จ้างไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100082215	บก.อก. บข.ศ.	ซ่อมห้องน้ำบ้านพักอัยสระ บข.ศ. (แฟลต 3, แฟลต 4)	6611220	499,600.00	499,600.00	10-พ.ค.-67	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2	4100082500	บก.อก. บข.ศ.	ซ่อมสิ่งของหลวง บข.ศ. ที่ข้าราชการ	6611220	10,000.00	10,000.00	1-พ.ย.-66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
3	4100083064	บก.อก. บข.ศ.	ระบบไม่กินรถยนต์ เข้า-ออก บข.ศ.	6611310	473,500.00	473,500.00	20-พ.ย.-66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
4	4100083103	บก.อก. บข.ศ.	ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกประตูด้วย อีเล็คทรอนิคส์ บข.ศ.	6611320	127,544.00	127,544.00	4-พ.ย.-66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
5	4100083129	สค.ป.	จ้างพิมพ์คู่มือก็เรียนนายสิบตำรวจ (นสค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6611230	15,167,250.00	15,167,250.00	29 ก.พ.67	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานตามกำหนด
6	4100050088	บก.ฝ.ภ.	งานรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณ บก.ฝ.ภ.	6611320	7,470,000.00	5,229,000.00	19 เม.ย.66 - 15 ธ.ค.66 ขยายสัญญา 126 วัน ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 66 - 19 เม.ย.67	งวดงานทั้งหมดมี 8 งวดงาน/ เบิกจ่ายไปแล้ว 4 งวดงาน (งวดงานที่ 5-8) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,241,000 บาท คงเหลืองวดงานที่ 1-4 เป็นเงินจำนวน 5,229,000 บาท ได้แก่ งวดงานที่ 1= 1,494,000 บาท งวดงานที่ 2= 1,494,000 บาท งวดงานที่ 3= 1,120,500 บาท งวดงานที่ 4= 1,120,500 บาท	"เบิกจ่ายงวดงานที่ 5 แล้ว จำนวน 373,500 บาท เมื่อ 1 ก.ย.66 และ เบิกจ่ายงวดงานที่ 6 จำนวน 373,500 บาท เมื่อ 26 ก.ย.66"	ปัจจุบัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ เปรียบเทียบจ้างให้ส่งมอบงานงวดที่ 4 โดยจะมีการประชุมพิจารณาตรวจสอบ รับงานฯ ในวันที่ 24 ม.ค.67
7	4100064945	ศูนย์วิทยุตำรวจ	เครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR) ระบบ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง	6611310	13,800,000.00	13,800,000.00	25 ก.ค.66 - 15 ก.ค.67	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบตามวันที่ ครบกำหนดสัญญา เนื่องจากมี อุปกรณ์ประกอบกันหลายอย่าง	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่ เพื่อ รอผู้รับจ้างมาส่งมอบงานตามกำหนด

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
8	4100075970	ศูนย์วิทยุโทรทัศน์การกระจาย	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ที่ใช้สำหรับการมีวิทยุทีวี ๓ ทีวี (ยี่ห้อ 8 คัน)	6611220	74,570.48	74,570.48	8 ก.ย.66 - 2 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จัดและตรวจเอกสารเบิกจ่าย	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
9	4100076279	ศูนย์วิทยุโทรทัศน์การกระจาย	งานก่อสร้างห้องนั่งเล่น/รับบริการฝึกอบรม บริเวณอาคารมีวิทยุโทรทัศน์	6611320	1,078,900.00	863,120.00	14 ก.ย.66 - 12 ม.ค.67	3 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 1 เป็นเงิน 215,780 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเบิกจ่าย งวดงานที่ 2 และส่งมอบงวดงานที่ 3 คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือน ก.พ.67
10	4100080952	ศูนย์วิทยุโทรทัศน์การกระจาย	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กล้องสำหรับการมีวิทยุ	6611220	100,000.00	100,000.00	11 ก.ย.66 - 17 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จัดและตรวจเอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย
11	4100081369	ศูนย์วิทยุโทรทัศน์การกระจาย	ค่าจัดซื้อที่ครอบหูสำหรับวิทยุ	6611220	40,000.00	40,000.00	13 ก.ย.66 - 18 พ.ย.66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	จัดและตรวจเอกสารเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย
			รวม บข.ศ. จำนวน 11 รายการ		38,841,364.48	36,384,584.48				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนวงจางทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง วงจางที่เหลือ (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
1	4100080423	รร.นเรศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์	6611310	3,537,940.00	3,537,940.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 วงจาง/ยังไม่ได้เบิกจาง	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
	4100080423	รร.นเรศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์	6611310	20,060.00	20,060.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 วงจาง/ยังไม่ได้เบิกจาง	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจางเพื่อจาง สทว. จัดหาใบภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นเรศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์	6611310	52,000.00	52,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 วงจาง/ยังไม่ได้เบิกจาง	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจางเพื่อจาง สทว. จัดหาใบภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นเรศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์	6611310	6,000.00	6,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 วงจาง/ยังไม่ได้เบิกจาง	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจางเพื่อจาง สทว. จัดหาใบภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นเรศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์	6611310	5,000.00	5,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 วงจาง/ยังไม่ได้เบิกจาง	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจางเพื่อจาง สทว. จัดหาใบภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นเรศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์	6611310	900,000.00	900,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 วงจาง/ยังไม่ได้เบิกจาง	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจางเพื่อจาง สทว. จัดหาใบภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นเรศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์	6611310	10,000.00	10,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 วงจาง/ยังไม่ได้เบิกจาง	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจางเพื่อจาง สทว. จัดหาใบภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา
	4100080423	รร.นเรศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์	6611310	265,000.00	265,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 วงจาง/ยังไม่ได้เบิกจาง	ยังส่งมอบสิ่งของไม่ครบตามสัญญา	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจางเพื่อจาง สทว. จัดหาใบภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่นำไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	35,000.00	35,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเพื่อจาก สทว. จัดทำใบภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
	4100080423	รร.นรต.	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.นรต	6611310	168,000.00	168,000.00	21 ก.ย. - 6 ต.ค.66	1 งวดงาน/ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเพื่อจาก สทว. จัดทำใบภาพรวม ซึ่งผู้ขายยังมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66
2	4100082712	รร.นรต.	จ้างเหมาซ่อมเตาอบขนมร้อน	6611220	73,756.80	73,756.80	26 ก.ย.66-26 พ.ย.66	1 งวด ตรวจรับเมื่อ 20 ต.ค.66 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ตรวจรับเมื่อ 20 ต.ค.66 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
			รวม รร.นรต. จำนวน 2 รายการ		5,072,756.80	5,072,756.80				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100070681	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต	6611220	35,000.00	35,000.00	7 ส.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
2	4100071887	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แบตเตอรี่เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพพื้นฐาน	6611220	10,000.00	10,000.00	1 ก.ย. 66 - 29 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
3	4100073051	รพ.ตร.	ซ่อมแซมหลังคาทางเดินหน้าอาคาร ขตร.	6611220	498,021.87	498,021.87	6 ก.ย. 66 - 4 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
4	4100075270	รพ.ตร.	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์เตียงโดยสาร (EL-5)	6611220	499,424.64	499,424.64	23 ส.ค. 66 - 20 พ.ย. 66	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
5	4100081488	รพ.รพ.ตร.	ซ่อมแซมระบบท่อเมนน้ำประปาและน้ำเสียของอาคาร 7พ.	6611220	443,472.20	443,472.20	27 ก.ย. 66 - 25 ม.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
			รวม รพ.ตร. จำนวน 5 รายการ		1,485,918.71	1,485,918.71				

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ให้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มนับและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
1	4100063061	พร.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ จำนวน 7 คัน เดือน ก.ย. 66-ธ.ค.66	6611220	4,657,800.00	205,352.00	1 ม.ย.63 - 30 ก.ย.67		เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 66
2	4100063065	พร.	ค่าจัดเช่ารถยนต์ จำนวน 18 คัน เดือน ก.ย. 66-ธ.ค.66	6611220	7,258,800.00	369,200.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70		เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 66
3	4100077197	พร.	แผงกั้นที่มีเครื่องหมาย "หยุดรถ" แบบมีสัญญาณไฟ	6611310	12,992,800.00	12,992,800.00	15 ก.ย.66 - 12 ก.พ.67	5 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคกก.ตรวจรับพัสดุ
4	4100059265	พร.	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งกำลังบำรุง	6611310	21,763,000.00	10,881,500.00	12 มิ.ย.66 - 9 ธ.ค.66	4 งวด/เบิกแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอแก้ไขสัญญา	อยู่ระหว่างเสนออัตรารับตรวจรับ งวด 3-4
5	4100081663	พร.	จอแสดงผลภาพ LED จำนวน 1 ชุด	6611310	1,790,000.00	1,790,000.00	27 ก.ย.66 - 26 พ.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างคกก.ตรวจรับพัสดุ
6	4100061661	พร.	รถยนต์ขนาด 1 คัน ประเภท OFF ROAD 4 WD ข.ตชด	6611310	62,350,000.00	62,350,000.00	8 มิ.ย.66 - 5 ธ.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
7	4100066955	กน.	ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการฯ สนบ.ตร. จำนวน 2 ลำ	6611500	21,150,000.00	21,150,000.00	8 ส.ค.66 - 7 พ.ค.67	2 งวด	คณะกรรมการตรวจรับงวด 1 แล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวด 1 และ 2
8	5100003978	กน.	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เดือน มี.ค.66-มิ.ย.66	6611500	93,345.20	93,345.20	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	1 งวด	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
9	5100004069	กน.	ค่าซ่อมเครื่องล้างจาน	6611500	100,000.00	100,000.00	28 ก.ย. - 13 ต.ค.66	1 งวด	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
10	4100064576	กน.	ค่าเช่ารถ เดือน ต.ค.66	6611500	9,263,000.00	3,920.00	1 พ.ค.63 - 30 ต.ค.67	1 งวด	เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
			รวม พธ. จำนวน 10 รายการ		141,418,745.20	109,936,117.20				
11	4100056761	ยธ.	งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม ตร.	6611220	177,500.00	177,500.00	1 มิ.ย.66 - 16 มิ.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย
12	4100078264	ยธ.	ซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย และพื้นที่ทางเข้า ส.ส.บ.ตร. ชั้น 4 อาคาร 1 ตร.	6611220	56,000.00	56,000.00	14 ก.ย. - 29 ก.ย.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย
13	4100082841	ยธ.	ซ่อมแซมผนังและสายไฟฟ้าภายในห้องชั้น 1 อาคาร 1 ตร	6611220	120,000.00	120,000.00	29 ก.ย.66 - 12 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดทั้งหมด/ปัจจุบันเป็นอีกกี่งวด (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน พ.ย.66	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
14	4100082859	ยธ.	ซ่อมแซมโคมไฟกลางแจ้งสำหรับผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.	6611220	499,000.00	499,000.00	20 มิ.ย.66 - 5 ก.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย
15	4100082964	ยธ.	ซ่อมแซมหม้อต้มน้ำดื่มร้อนระบบรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.	6611220	495,000.00	495,000.00	26 ก.ย.66 - 11 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย
16	4100081972	ยธ.	เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ขนาด 24,000 BTU	6611310	654,400.00	654,400.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
	4100081972	ยธ.	พัดลมดูดอากาศ	6611310	9,900.00	9,900.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
	4100081972	ยธ.	โต๊ะทำงาน พร้อมโต๊ะข้าง	6611310	360,000.00	360,000.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
	4100081972	ยธ.	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน พนักพิงสูง	6611310	130,800.00	130,800.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
	4100081972	ยธ.	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน (หนักโต๊ะ)	6611310	135,000.00	135,000.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
	4100081972	ยธ.	ตู้เซิร์ฟเวอร์	6611310	99,000.00	99,000.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
	4100081972	ยธ.	โต๊ะทำงานพร้อมลิ้นชัก ขนาด 0.60 x 1.20 x 0.75 ม.	6611310	65,269.00	65,269.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
	4100081972	ยธ.	เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน	6611310	249,000.00	249,000.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
	4100081972	ยธ.	โทรทัศน์ LED ขนาด 55 นิ้ว	6611310	178,800.00	178,800.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
	4100081972	ยธ.	งานปรับปรุงห้องทำงานชั้น 6 อาคาร ๓. เบื้องหลัง กง.๓๓.	6611320	3,155,400.00	3,155,400.00	19 ก.ย.66 - 16 ม.ค.67	ทั้งหมด 2 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
17	4100075373	ยธ.	ปรับปรุงระบบปรับอากาศประจำห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 1 สกบ.	6611310	230,000.00	230,000.00	8 ก.ย.66-๓๑.๑๐.๖๖	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง การส่งมอบพื้นที่	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน
18	4100082960	ยธ.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์ ยธ.	6611310	488,348.00	488,348.00	28 ก.ย.66 - 28 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด เบิกจ่าย 1 งวด	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย	ส่งเบิกจ่าย กง.แล้ว
19	4100083051	ยธ.	จัดหาและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประจำห้องรับรองและห้องประชุมภายใน อาคาร 1 ตร.	6611310	330,000.00	330,000.00	27 ก.ย. - 27 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลเสนอขอเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค. 67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
20	4100082944	ยธ.	โต๊ะประชุมชนิดพับได้แบบมีล้อเลื่อน	6611310	235,620.00	235,620.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค. 67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค. 67)
	4100082944	ยธ.	โต๊ะประชุมโค้งลำหรับประธานชนิดพับได้แบบมีล้อเลื่อน	6611310	8,840.00	8,840.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
	4100082944	ยธ.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงกลาง ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขน	6611310	238,140.00	238,140.00	27 ก.ย. - 11 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
	4100082944	ยธ.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงสูง ชนิดมีที่รองคอ ชนิดล้อเลื่อน	6611310	15,900.00	15,900.00	27 ก.ย. - 11 ก.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
21	4100082935	ยธ.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงกลาง ชนิดล้อเลื่อนมีเท้าแขน	6611310	136,080.00	136,080.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
	4100082935	ยธ.	เก้าอี้ประชุมพนักพิงสูง ชนิดมีที่รองคอ ชนิดล้อเลื่อน	6611310	15,900.00	15,900.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
	4100082935	ยธ.	ชุดโต๊ะประชุม	6611310	52,020.00	52,020.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
	4100082935	ยธ.	เก้าอี้ขาตาย ชนิดขาโลหะ	6611310	180,000.00	180,000.00	27 ก.ย. - 12 ต.ค. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
22	4100082787	ยธ.	จัดซื้อकुณที่ประจำสำนักงาน ยธ. จำนวน 4 รายการ	6611310	49,000.00	49,000.00	28 ก.ย. 66 - 27 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
	4100082787	ยธ.	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x63x104 ซม.	6611310	66,000.00	66,000.00	28 ก.ย. 66 - 27 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
	4100082787	ยธ.	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 65x69x111 ซม.	6611310	138,000.00	138,000.00	28 ก.ย. 66 - 27 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
	4100082787	ยธ.	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ SMART TV 55 นิ้ว	6611310	90,000.00	90,000.00	28 ก.ย. 66 - 27 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย
23	4100082789	ยธ.	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ SMART TV 75 นิ้ว	6611310	299,920.00	299,920.00	28 ก.ย. 66 - 27 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย
	4100082789	ยธ.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	6611310	198,760.00	198,760.00	28 ก.ย. 66 - 28 ต.ค. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย
24	4100082788	ยธ.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต LIDAR (สกน.)	6611310	480,200.00	480,200.00	29 ก.ย. 66 - 27 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย 81
25	4100082790	ยธ.	ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายโยธาธิการ 1 ยธ.สกน.	6611320	447,700.00	447,700.00	28 ก.ย. 66 - 7 พ.ย. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่	อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่าย
26	4100082904	ยธ.	ปรับปรุงห้องทางเดินชั้น 4 อาคาร 1 สกน.	6611320	496,000.00	496,000.00	28 ก.ย. 66 - 12 ต.ค. 66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างตรวจสอบ PO	อยู่ระหว่างประมวลผลของเบิกจ่าย

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ขยับ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
27	4100081343	ยธ.	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	6611320	463,200.00	463,200.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอ จด หรือลด ค่าปรับ	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
28	4100081342	ยธ.	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสโมสรตำรวจ พลกสิ	6611320	470,000.00	470,000.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอ จด หรือลด ค่าปรับ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอ จด หรือลด ค่าปรับ
29	4100081340	ยธ.	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องประชุมและฝึกอบรม ขนาด 2 ชั้น นนทบุรี	6611320	460,000.00	460,000.00	26 ก.ย.66-26 ต.ค.66	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอ จด หรือลด ค่าปรับ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอ จด หรือลด ค่าปรับ
30	4100045300	ยธ.	ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและพื้นที่ฟู ข้าราชการตำรวจ	6611320	289,847,980.00	159,057,000.00	1 ต.ค.2562 - 12 พ.ค.2566 (ค่าปรับร้อยละ 0 ถึงวันที่ 16 ส.ค.68)	ทั้งหมด 87 งวด เบิกจ่าย 72 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
31	4100081302	ยธ.	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.สุพิจิตรพร้อมที่ จอดรถและห้องพัก	6611320	44,385,370.00	42,534,000.00	9 ก.พ.2564 - 12 ต.ค.2566	ทั้งหมด 20 งวด เบิกจ่าย 7 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
32	4100081288	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและ ที่จอดรถ	6611320	12,994,470.00	8,223,422.00	10 พ.ย.64 - 25 พ.ย.2566	ทั้งหมด 31 งวด เบิกจ่าย 26 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (อยู่ ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแก้ไข	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
33	4100081281	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและ ที่จอดรถ	6611320	12,762,450.00	3,323,700.00	3 พ.ย.2564-13 ม.ค.2567	ทั้งหมด 31 งวด เบิกจ่าย 25 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (อยู่ ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแก้ไข	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
34	4100062399	ยธ.	อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถแต่ละอาคาร ที่พิทกาศย์	6611320	381,660,483.00	381,660,483.00	22 ก.พ.2566 - 24 ส.ค.2569	ทั้งหมด 300 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -เบิกเงินล่วงหน้าแล้ว
35	4100069986	ยธ.	ก่อสร้างบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เสียว) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครั	6611320	34,408,918.00	21,725,716.00	1 ก.พ.2565 - 16 ธ.ค.2567	ทั้งหมด 63 งวด เบิกจ่าย 22 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
36	4100081304	ยธ.	ก่อสร้างบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เสียว) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครั	6611320	25,171,600.00	25,171,600.00	1 ก.พ.2565 - 16 ธ.ค.2567	ทั้งหมด 63 งวด เบิกจ่าย 22 งวด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา
37	4100058421	สพ.	รวม ยธ. จำนวน 26 รายการ		813,205,968.00	653,670,618.00				
38	4100057998	สพ.	เลขหรือรับเข้าสำหรับพลชุมชนিং และเครื่องวัด ความเร็วลม	6611310	1,776,000.00	1,776,000.00	12/06/2566 - 8/03/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
39	4100065075	สพ.	จัดทำศูนย์นศตรวจการณ์ทางฟูลทรีวี บก.ป.	6611310	14,649,000.00	14,649,000.00	12/06/2566 - 6/06/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
			กล้องตรวจการณ์แบบ 2 ตา บก.ป.	6611310	8,893,000.00	8,893,000.00	14/07/2566 - 9/04/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
40	4100059688	สพ.	รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกัน การจู่โจมเปิดด้วยคลื่นความถี่	6611310	48,860,000.00	48,860,000.00	22/06/2566 - 18/03/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
41	4100046762	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการร้าย สภาค และเพิ่มขีดความสามารถในการถวาย ความปลอดภัย บก.สอ.บ.ช.ตชด.	6611311	2,904,000.00	2,904,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา เฉพาะรายการกล้องเลเซอร์วัดระยะ พดชื่นเชิงจำนวน 6 กล้อง	อยู่ระหว่างบงอกเลิกสัญญา	อยู่ระหว่างบงอกเลิกสัญญา
42	4100065724	สพ.	รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกัน การจู่โจมเปิดด้วยคลื่นความถี่โทรศัพท์วิทยุมือ ถือ	6611310	49,990,000.00	49,990,000.00	27/07/2566 - 27/05/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
43	4100082337	สพ.	โครงการปรับปรุงห้องงานบันและห้องสุขา คลัง เก็บวัสดุระเบิด กองสรรพาวุธ อ.ชะอำ จว. เพชรบุรี (สทบ.)	6611320	420,000.00	420,000.00	27/09/2566 - 26/12/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รายงานผลการตรวจรับ
44	4100082351	สพ.	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กอง รักษาการณ์ กองสรรพาวุธ อ.ชะอำ จว. เพชรบุรี (สทบ.)	6611320	480,000.00	480,000.00	27/09/2566 - 26/12/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ รายงานผลการตรวจรับ
45	4100082586	สพ.	ปรับปรุงคลังอาวุธปืน อาคารคลังจระเข้ สทบ.	6611320	499,000.00	499,000.00	27/09/2566 - 26/12/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
46	4100071348	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการ	6611310	60,480,000.00	30,240,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
47	4100071348	สพ.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพล	6611310	46,000,000.00	23,000,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
47	4100071310	สพ.	เสื่อเกาะป้องกันกระสุน ระดับ 3 (เสื่อเกาะ อ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่น	6611310	94,680,000.00	47,340,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
47	4100071310	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการ	6611310	3,945,000.00	1,972,500.00	31/08/2566 - 25/08/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
47	4100071310	สพ.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพล	6611310	7,500,000.00	3,750,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนวงงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด งานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า
	4100071310	สพ.	หมวกป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A บข.ตชด.	6611310	88,400,000.00	44,200,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)
48	4100062927	สพ.	เครื่องยิงลูกกระเบิด ขนาด 40 มม. แบบ 6 ลูก บก.ปพ.	6611310	12,570,000.00	12,570,000.00	14/07/2566 - 29/05/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
49	4100071367	สพ.	ขาค้ำปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน บก.ปพ.	6611310	1,000,500.00	1,000,500.00	31/08/2566 - 27/02/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
50	4100071398	สพ.	เดสก์ท็อปสำหรับชุดยิง และเครื่องวัด ความเร็วลม บก.ปพ.	6611310	3,300,000.00	3,300,000.00	31/08/2566 - 27/05/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
51	4100081705	สพ.	กระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. จำนวน 3,368,995 นัด	6611230	67,211,450.25	67,211,450.25	26/09/2566 - 21/08/2567	ทั้งหมด 1 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
52	4100067191	สพ.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 150 คัน	6610310	395,550,000.00	336,217,500.00	26/07/2566 - 11/04/2567	ทั้งหมด 3 งวด เบิกจ่าย 1 งวด	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
			รวม สพ. จำนวน 16 รายการ		909,107,950.25	699,272,950.25				
			รวม สกบ. จำนวน 52 รายการ		1,863,732,663.45	1,462,879,685.45				

- 3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค.67
(งป.)

สถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เฉพาะรายการผูกพันเดิม + ปีเดียว (จำเป็น))

จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ลำดับ	หน่วย	งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)		เบิกจ่ายสะสม		ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	
		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน
รวมทั้งสิ้น		24	2,754,759,900.00	14	511,918,261.18	7	539,492,838.82	10	1,703,348,800.00
1	บ.ตร.	1	950,000,000.00	-	-	-	-	1	950,000,000.00
2	บข.น.	2	27,186,400.00	2	27,186,400.00	-	-	-	-
3	ภ.3	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	-	-	-	-
4	ภ.5	1	7,600,000.00	1	7,600,000.00	-	-	-	-
5	บข.ก.	2	85,856,200.00	1	51,526,000.00	1	6,714,000.00	1	27,616,200.00
6	บข.สอพ.	3	78,087,800.00	3	76,121,300.00	1	1,966,500.00	-	-
7	สกบ.	14	1,600,029,500.00	6	343,484,561.18	5	530,812,338.82	8	725,732,600
7.1	จัดหาให้ บข.น.	4	69,570,700.00	2	21,230,490.00	1	10,303,510.00	2	38,036,700.00
7.2	จัดหาให้ บข.ตชด.	1	12,154,000.00	-	-	-	-	1	12,154,000.00
7.3	จัดหาให้ บข.ศ.	1	7,668,400.00	-	-	-	-	1	7,668,400.00
7.4	จัดหาให้ รพ.ตร.	2	101,154,100.00	1	33,240,000.00	1	51,000,000.00	1	16,914,100.00
7.5	จัดหาให้ ตร.	6	1,409,482,300.00	3	289,014,071.18	3	469,508,828.82	3	650,959,400.00

หมายเหตุ : ปีเดียว ลำดับ 1 รายการ ซ่อมอากาศยานฯ ลำดับ 5 รายการซ่อมเรือใหญ่ / ย่อยเรือตรวจการณ์

เปรียบเทียบสถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เฉพาะรายการผูกพันเดิม + ปีเดียว (ถ้าเป็น))

จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ระหว่างประจําเดือน พฤศจิกายน 2566 กับประจําเดือน มกราคม 2567

สถานะ	ประจําเดือน พ.ย.66			ประจําเดือน ม.ค.67			เพิ่ม/ลดลง		
	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.66			ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค.67			รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
1. งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	24	2,754,759,900.00	100.00	24	2,754,759,900.00	100.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	4	1,048,010,200.00	38.04	4	1,048,010,200.00	38.04	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20	1,706,749,700.00	61.96	20	1,706,749,700.00	61.96	-	-	-
2. ทำใบสั่งซื้อจ้าง (PO)	2	27,186,400.00	0.99	14	511,918,261.18	18.58	12	484,731,861.18	1,782.99
ค่าครุภัณฑ์			-	1	51,526,000.00	4.92	1	51,526,000.00	100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2	27,186,400.00	1.59	13	460,392,261.18	26.97	11	433,205,861.18	1,593.47
3. เบิกจ่าย	-	-	-	7	539,492,838.82	19.58	7	539,492,838.82	100.00
ค่าครุภัณฑ์			-	1	6,714,000.00	0.64	1	6,714,000.00	100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	6	532,778,838.82	31.22	6	532,778,838.82	100.00
4. ยังไม่ทำใบสั่งซื้อจ้าง (PO) (ติดตามความก้าวหน้า)	22	2,727,573,500.00	99.01	10	1,703,348,800.00	61.83	12	1,024,224,700.00	37.55
ค่าครุภัณฑ์	4	1,048,010,200.00	100.00	3	989,770,200.00	94.44	1	58,240,000.00	5.56
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18	1,679,563,300.00	98.41	7	713,578,600.00	41.81	11	965,984,700.00	57.51

รายงาน ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

บ.ศร.

ผู้บันทึก : ส.ต.ต.อนุสรณ์ คัมภีร์พัฒนาไพศาล เบอร์โทร : 0958147694																
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ งบประมาณ	พฐ/ ยพ/ บูร	รหัส งบประมาณ	ผลผลิต/ โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปดังก่อน	สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
1	บ.ศร.	บ.ศร.	ยพ.	2500702007 7703120022	ค.บั้งไฟเจ้า	บั้งไฟเจ้า	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ค่าซ่อมบำรุงรถอากาฮายาน บ.ศร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	950,000,000.00	0.00	0.00	950,000,000.00	- ประชุมเดือน พ.ย. 66 อยู่ระหว่างขอรับ ความเห็นชอบแผน ฯ และขออนุมัติ ประกาศแผน ฯ	- อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติใช้ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ ขอรับความเห็นชอบในการ ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมบำรุงอากาฮ ยานา และแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง
										รวมรายการปีเดียว	950,000,000.00	0.00	0.00	950,000,000.00		
										รวมทั้งหมด	950,000,000.00	0.00	0.00	950,000,000.00		
										รวม พ.ร.บ.	950,000,000.00	0.00	0.00	950,000,000.00		
1																

รายงาน ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567
บพ.ก.

ผู้บันทึก : จ.ส.ต.หญิง ชญุตตราภรณ์ มากชุ่ม เบอร์โทร : 0801145415													จำนวนเงิน(หน่วยบาท)			
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ งบประมาณ	พฐ./ ยพ/ ปฐา	รหัส งบประมาณ	ผลผลิต/ โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปกลางก่อน	สร้างไปถึงข้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลรั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท) ความก้าวหน้า
1	บพ.ก.	บพ.ก.	ยพธ.	2500700002 703120007	นมมันคงฯ	น่านน้ำ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ค่าซ่อมยอเรือตรวจการณ์ บพ.ก. ตำบลบางหัว อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 141 ลำ	20,193,000.00	0.00	0.00	20,193,000.00	- ประชุมเดือน พ.ย.66 ซ่อมทั้งหมดจำนวน 141 ลำ โดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประมาณ 3 ลำ (เรือส่วนกลาง) ส่วนที่เหลือใช้วิธี เฉพาะเจาะจง กำหนดให้หน่วยที่ได้รับ งบประมาณ จัดส่ง รายการซ่อมหากภายใน วันที่ 15 พ.ย.66 เพื่อ กำหนดวงเงินค่าซ่อม ของแต่ละลำ	- อนุมัติสรรงบประมาณให้แต่ละ กท.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการจ้างซ่อมเรือแต่ละลำ
										รวมรายการปีเดียว	20,193,000.00	0.00	0.00	20,193,000.00		
										รวมทั้งหมด	20,193,000.00	0.00	0.00	20,193,000.00		
										รวม พ.ร.บ.	20,193,000.00	0.00	0.00	20,193,000.00		

รายงาน ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

สทง.

ผู้บันทึก : ส.ค.อ.หญิง ภาวิณี ชูพันธ์ เบอร์โทร : 0899519667											จำนวนเงิน(หน่วยบาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ งบประมาณ	พยุ/ ยุ/ บูฯ	รหัสงบประมาณ	ผลสัม/ โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปทางก่อน	สร้างไปสิ่งก่อสร้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
1	สทง.	บข.สชค.	ยุทศ.	25007070002 703120001	นมัสดง	นมัสดง ขายแดน	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ผูกพันเดิม	รถยนต์ในการะกับกระสุน ลีอานง 4x4 ชนิดลำเลียง บข. ตด.แวงเพญ่าเฒ่า เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน วงเงินทั้งสิ้น 130,900,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 26,180,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 92,566,000 บาท ปี 2567 ยุทพันงบประมาณ12,154,000 บาท	12,154,000.00	0.00	0.00	12,154,000.00	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	- จัดสรรต่างประเภท - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายโดย รอนึ่งสื่อเรียกเก็บเงินจาก ธนาคารกรุงไทย
1										รวมรายการผูกพัน	12,154,000.00	0.00	0.00	12,154,000.00		
1	สทง.	บข.น.	ยุทศ.	25007020077 703220010	ค.บ.ค.บ.เข้า	บ.ค.บ.เข้า	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการถาวรที่ตรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่จอดรถ และที่จอดรถ แสงรัชชภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 139,000,000 บาท ปี 2563-2564 ตั้งงบประมาณ 69,660,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 9,292,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 22,518,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 37,530,000 บาท	14,636,700.00	0.00	0.00	14,636,700.00	- จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างท่างานเสนอขอแก้ไข สัญญา	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตาม สัญญา - ตรวจรับแล้ว 7 งวด จากทั้งหมด 20 งวด

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ งบประมาณ	พหุ/ ยุท/ บูร	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/ โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปตราบก่อน	สร้างในสิ้นปีตั้ง (FO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสรุปรก่อน	ความก้าวหน้า
2	สทบ.	บ.ช.ม.	ยุทธ.	25007020077 703220036	ค.บ.ังค้ำใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สท.ม.ของห้อง พร้อมที่กั แขนง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 36,000,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 7,200,000 บาท ปี 2568 ยุติงบประมาณ 136,800,000 บาท	23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	- จัดจ้างโดยวิธีประกวด เชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ประเภทประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขึ้นเสนอ ราคา วันที่ 31 ต.ค.66 ปรากฏ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ การประกวดราคาดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ	- อยู่ระหว่าง สท.ก. รั้ง TOR และ คำนวณราคากลาง	
3	สทบ.	บ.ช.ศ.	ยุทธ.	25007540064 703220043	ค.บ.ังค้ำใช้	ศึกษา	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการวิจัยตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 230,076,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 11,503,800 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 65,188,500 บาท ปี 2568 ยุติงบประมาณ 153,384,600 บาท	7,668,400.00	0.00	7,668,400.00	- จัดจ้างโดยวิธีประกวด ชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง กับ ตร.	- อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน ราคาก่อสร้าง เพื่อจะอนุมัติจ้าง ต่อไป	
4	สทบ.	ท.พ.ศ.	ยุทธ.	25007020077 703220001	ค.บ.ังค้ำใช้	สุภาพ	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	โครงการโรงพยาบาลตำรวจสวนกุหลาบ (ศูนย์ผู้สูงอายุ ทหารที่มิ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 368,767,000 บาท ปี 2563-2564 ตั้งงบประมาณ 137,787,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 16,914,100 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 94,592,300 บาท ปี 2568 ยุติงบประมาณ 119,472,700 บาท	16,914,100.00	0.00	16,914,100.00	- จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอ ขอบัญชีสัญญา	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตาม สัญญา - ครบเรียบร้อยแล้ว 16 งวด จากทั้งหมด 26 งวด	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ งบประมาณ	พ.ช./ ช.พ./ ป.ว.	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต/ โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีศึกษา/ ผูกพัน	รายการ	พ.ร.บ. ปี 2566 ไปต่างก่อน	สร้างในสี่ปี (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสร้งก่อน	ความก้าวหน้า
5	สท.	ศร.	ช.พ.	25007020077 703220034	ค.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการหออาหารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พัก อาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 4,078,900,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 817,896,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 668,771,000 บาท ปี 2568 ยุคหนึ่งงบประมาณ 1,205,691,100 บาท ปี 2569 ยุคหนึ่งงบประมาณ 1,386,541,900 บาท	531,632,400.00	0.00	0.00	531,632,400.00	- จัดจ้างโดยวิธีประกวดเชิญ ขนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ดำเนินการก่อสร้าง)	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา - อยู่ระหว่างรอการส่งมอบพื้นที่ให้ ผู้รับจ้าง
6	สท.	ศร.	ช.พ.	25007020077 703220035	ค.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารที่ทำการหออาหารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 908,000,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 181,600,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2568 ยุคหนึ่งงบประมาณ 272,399,700 บาท ปี 2569 ยุคหนึ่งงบประมาณ 272,399,700 บาท ปี 2570 ยุคหนึ่งงบประมาณ 181,600,600 บาท	118,040,000.00	0.00	0.00	118,040,000.00	- จัดจ้างโดยวิธีประกวดเชิญ ขนทั่วไป (e-bidding) ประกวดประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วหนึ่งครั้ง ไม่ได้ผลการประกวดราคา (เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคา เห็นรายชื้อว่า ไม่ผ่าน คุณสมบัติ) และได้ผู้คัดเลือก การประกวดราคาดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ พิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของ งานจากคณะกรรมการฯ เพื่อ เสนอประกวดราคา ใหม่	- อยู่ระหว่างเสนอผู้มีผู้รับราคา กลางและTOR และขอรับความ เห็นชอบดำเนินการประกวดราคา
7	สท.	ศร.	ช.พ.	25007540064 703220006	ค.ปฎิรูปฯ	ที่พัค	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพันเดิม	อาคารบ้านพักส่วนกลาง ศร. (เสียฯ) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 คอนกรีต รมยที่ 4 สท.(สท.) แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 231,592,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 46,400,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 54,032,800 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,930,800 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 59,403,400 บาท ปี 2568 ยุคหนึ่งงบประมาณ 69,825,000 บาท	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	- จัดจ้างโดยวิธีประกวดเชิญ ขนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างเสนอผู้นิติตั้ง กับ ศร.	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตาม สัญญา - ตรวจรับแล้ว 22 งวด จากทั้งหมด 63 งวด
7										รวมรายการผูกพัน	713,578,600.00	0.00	0.00	713,578,600.00		
8										รวมทั้งหมด	725,732,600.00	0.00	0.00	725,732,600.00		
8										รวม พ.ร.บ.	725,732,600.00	0.00	0.00	725,732,600.00		

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- 4.1 การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สงป.)

4.2 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ ตร. (สงป.)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ
